





Índice de contenidos



¿Qué es Rooma?



¿Por qué Rooma?



¿Qué hay detrás de Rooma?



¿Quiénes somos?



¿Cómo nos ha ido?



¿Qué sigue?

1. ¿Qué es Rooma?



Antes de Rooma



Después de Rooma



2. ¿Por qué Rooma?



Funcionalidad	 Rooma	 badi	 id	 BeRome	
Encontrar piso/compañero	Swipe & Match	Swipe & Match	Lista	Swipe & Match	Lista
Verificación de usuarios	Verificación con foto	Verificación básica	No	Verificación básica	Email
Reviews de usuarios	Convivencia	No	No	No	No
Tickets/ Incidencias	Sí	No	No	No	No
Gestión de gastos y facturas	Automática con pagos integrados	No	No	No	No

Mis Inmuebles

Gestiona tu cartera de propiedades

+ Publicar nuevo inmueble



Piso en Triana

600 € / mes

0

2

Vista del arrendador

✎ Editar

⏸ Pausar



Piso en Macarena

📍 Calle Ejemplo 20 2ºA

500 € / mes



Vista del inquilino


Cargando conversación...

Vista del inquilino

*El chat está
disponible al hacer
match

Mis Solicitudes

Pendientes

Match **1**



Piso en Macarena

450 €

Ejemplo

tenant2000@test.com

Aceptada

Vista del arrendador

Vista del arrendador

Disponible desde 2026-04-05. Fianza: 1 mes(es).

ESTADO

Activo

PRECIO

750 EUR

UBICACION

Ronda de Triana

GASTOS

agua, luz, gas,
internet, comunidad

UBICACION

Ronda de Triana

GASTOS

agua, luz, gas, internet, comunidad

ACCIONES

Gestion del inmueble

Acceso rapido

 Ver Facturas

 Anadir Factura

 Ver Incidencias

3. ¿Qué hay detrás de Rooma?



Ciclo de trabajo



Metodología - Scrum Personalizado

¿Qué hemos eliminado?



Daily scrum y reuniones fijas

¿Qué hemos adaptado?



Comunicación en Scrum puro




Empezamos los jueves



Weekly Scrum

Workflows CI

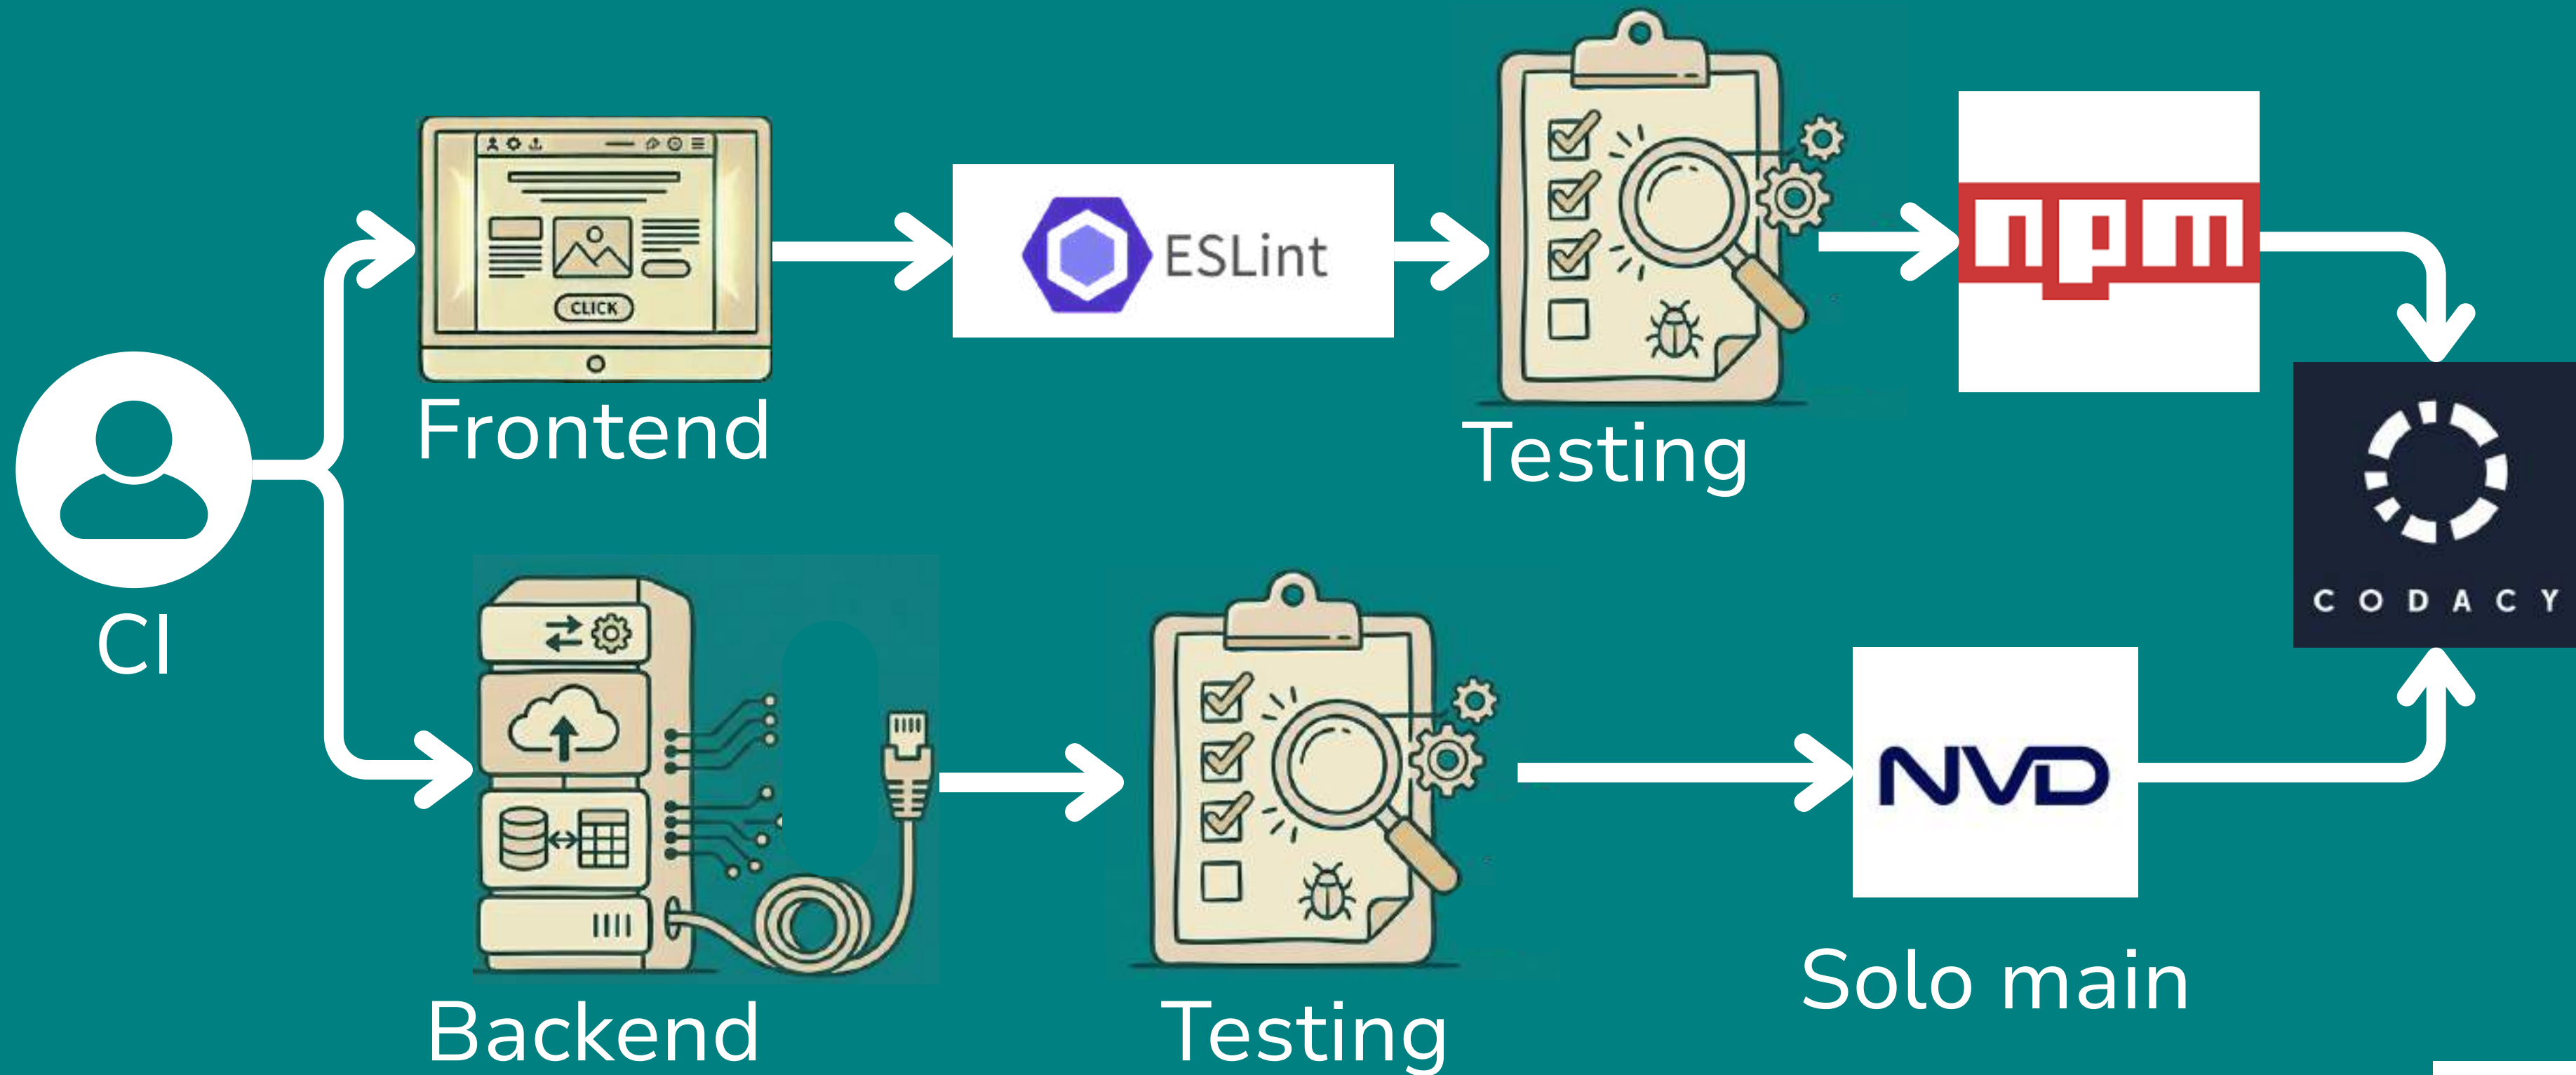


Workflow CD

Workflow CI



Solo main y trunk



Despliegue
Backend



Monitoreo



Despliegue
Frontend




Herramientas para la gestión

Versionado



Gestión ágil

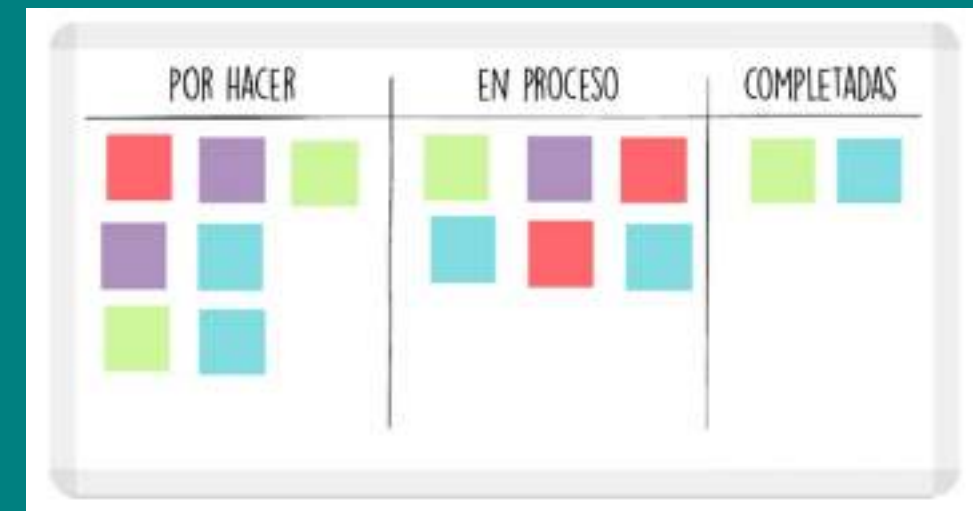

Documentación



Herramientas de equipo



Stack tecnológico


Backend

Datos

Integración

Lógica

Seguridad




Frontend

Navegación

Experiencia

Flujos

Estabilidad



Testing

Estrategia



Smoke
test



Regression
test



Sanity
test

Tecnologías

Backend



Frontend



Definición de hecho

Funcionalidad hecha si....



Cumple criterios
de aceptación



Se valida en el
entorno de sprint



Está desplegada
y operativa



Incluye las pruebas
necesarias

Definición de hecho

Métricas de calidad



Coverage

$\geq 80\%$ objetivo


$\geq 85\%$ óptimo



Defect leakage

$< 10\%$ objetivo

$< 5\%$ muy sólido



Lead time

< 7 días por issue

4. ¿Quiénes somos?




Estructura del equipo




Equipo 1



Equipo 2

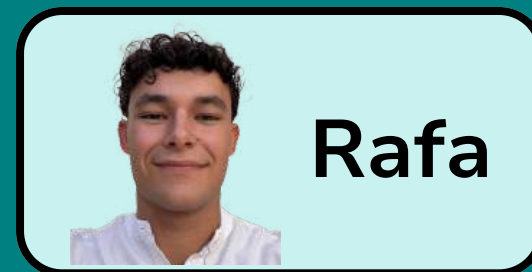

Equipo 3

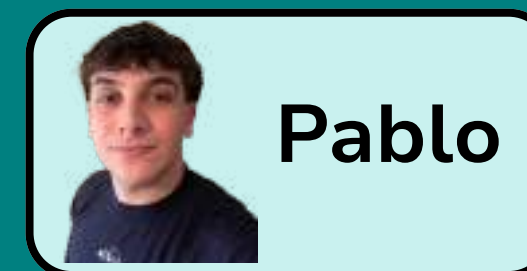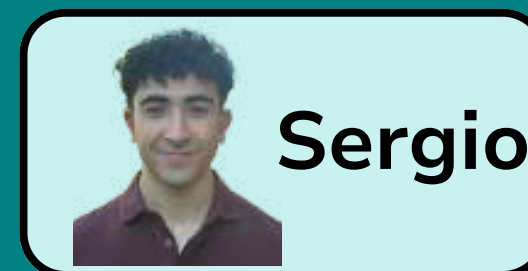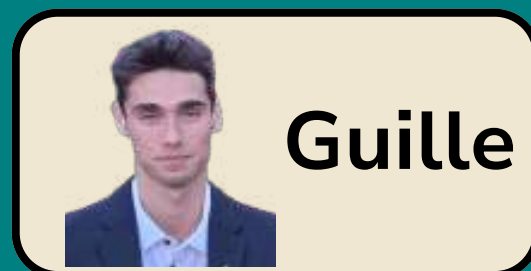

Estructura del equipo

Coordinador 1



Coordinador 2



Coordinador 3



Estructura del equipo

Product Owner



Coordinador 1



Coordinador 2



Coordinador 3



Estructura del equipo

Product Owner



Coordinador 1




Coordinador 2



Coordinador 3



Product Marketer

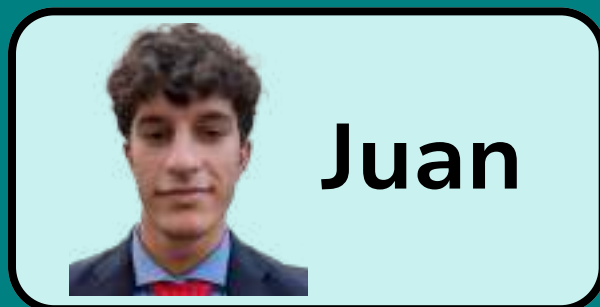

Tesorero



Product Marketer



Lider QA



Product Marketer



Team Building

Encuentros Semanales



Actividades deportivas



Escapadas



Otras ideas



Team Building

Encuentros Semanales



Team Building

Encuentros Semanales



Actividades deportivas



Escapadas



Otras ideas



Team Building

Actividades deportivas



Team Building

Encuentros Semanales



Actividades deportivas



Escapadas



Otras ideas



Team Building

Escapadas



Team Building

Encuentros Semanales



Actividades deportivas



Escapadas



Otras ideas




Team Building

Otras ideas




Commitment Agreement

Tiempo total trabajado en Sprint 2

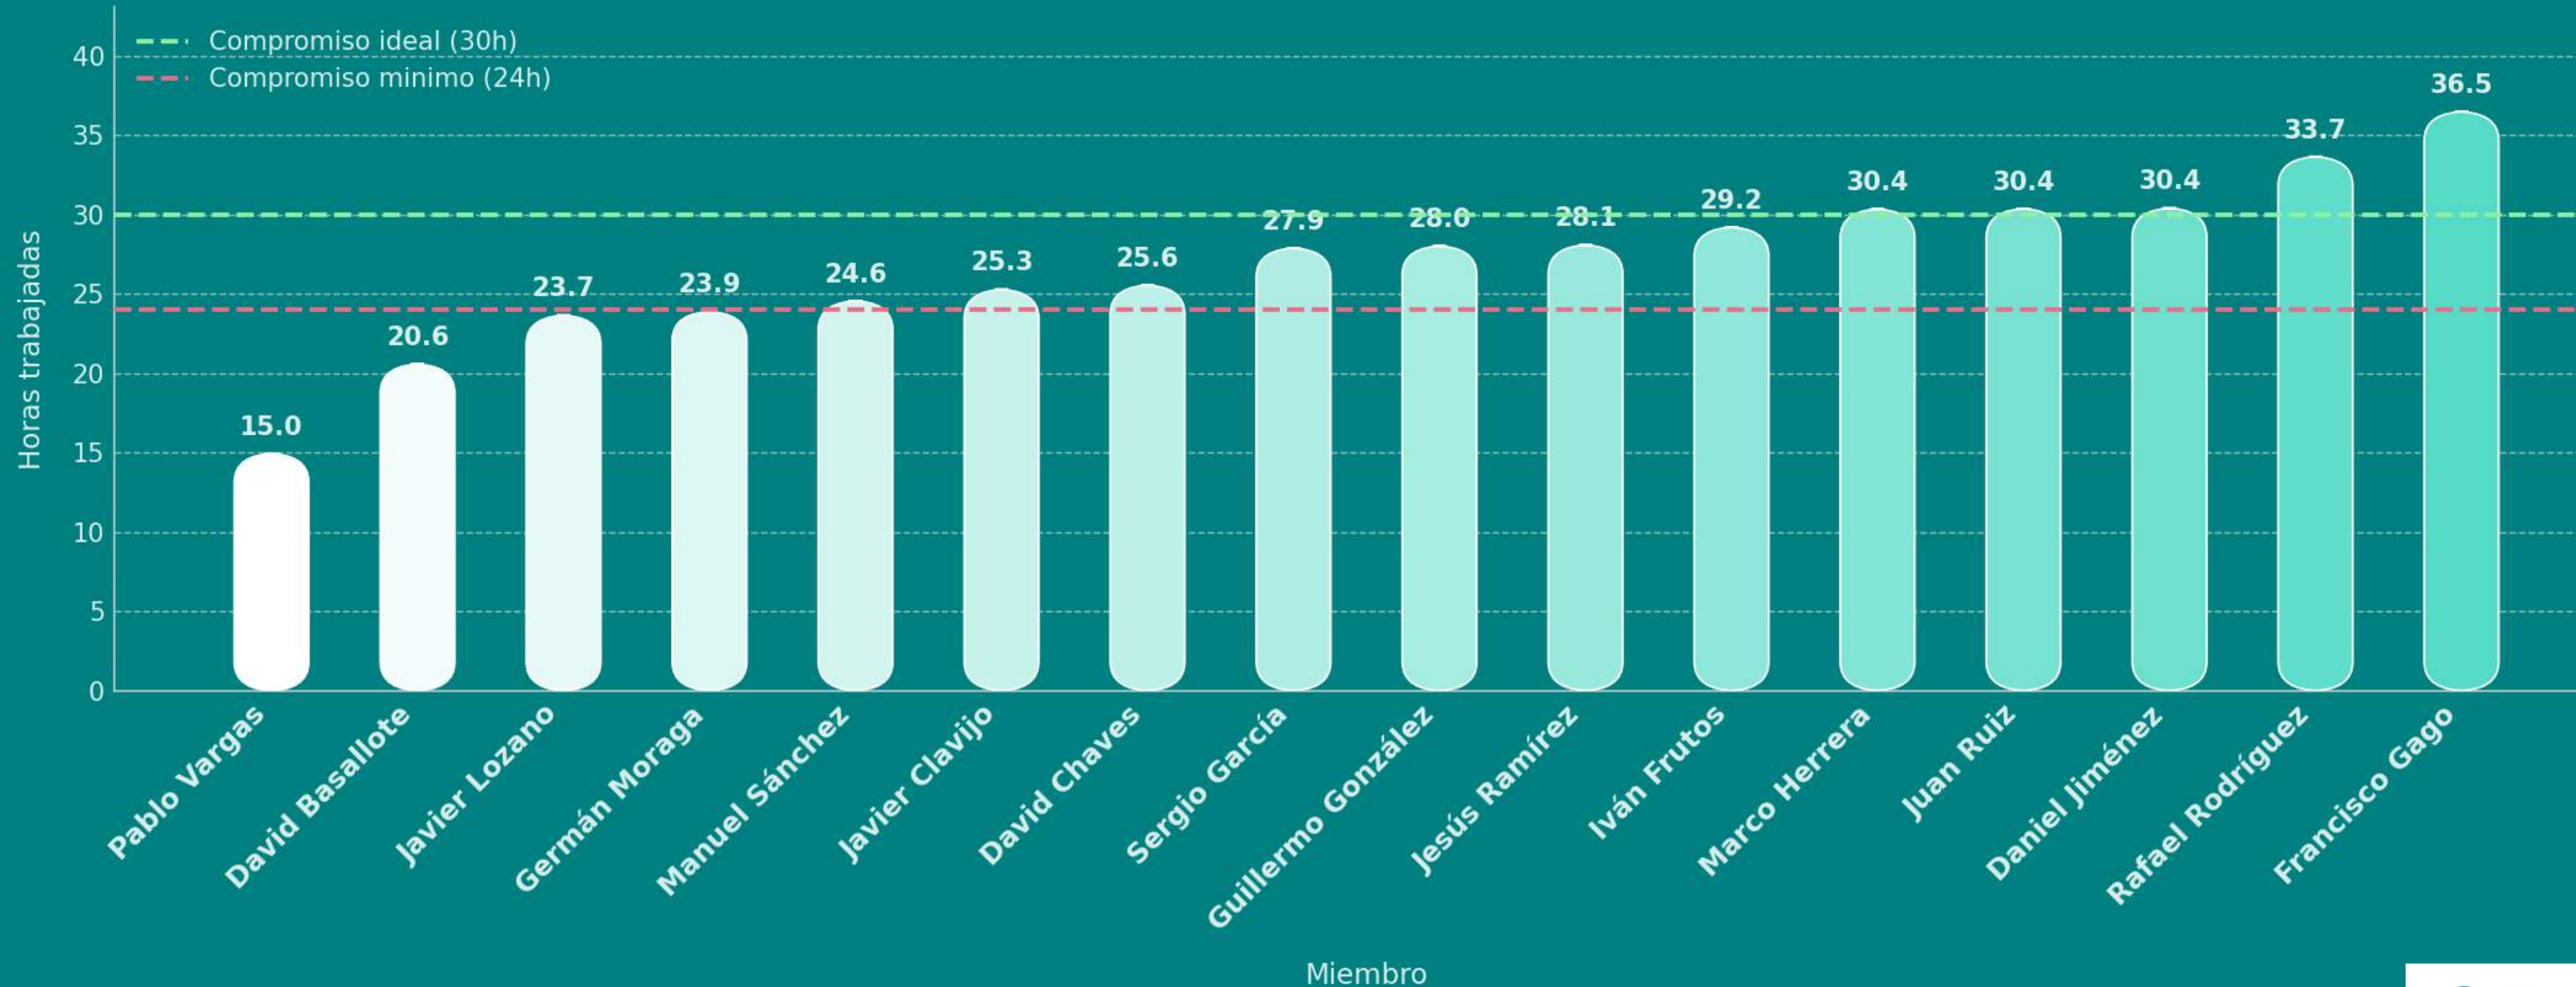

Commitment Agreement


Tiempo total trabajado desde el inicio del proyecto

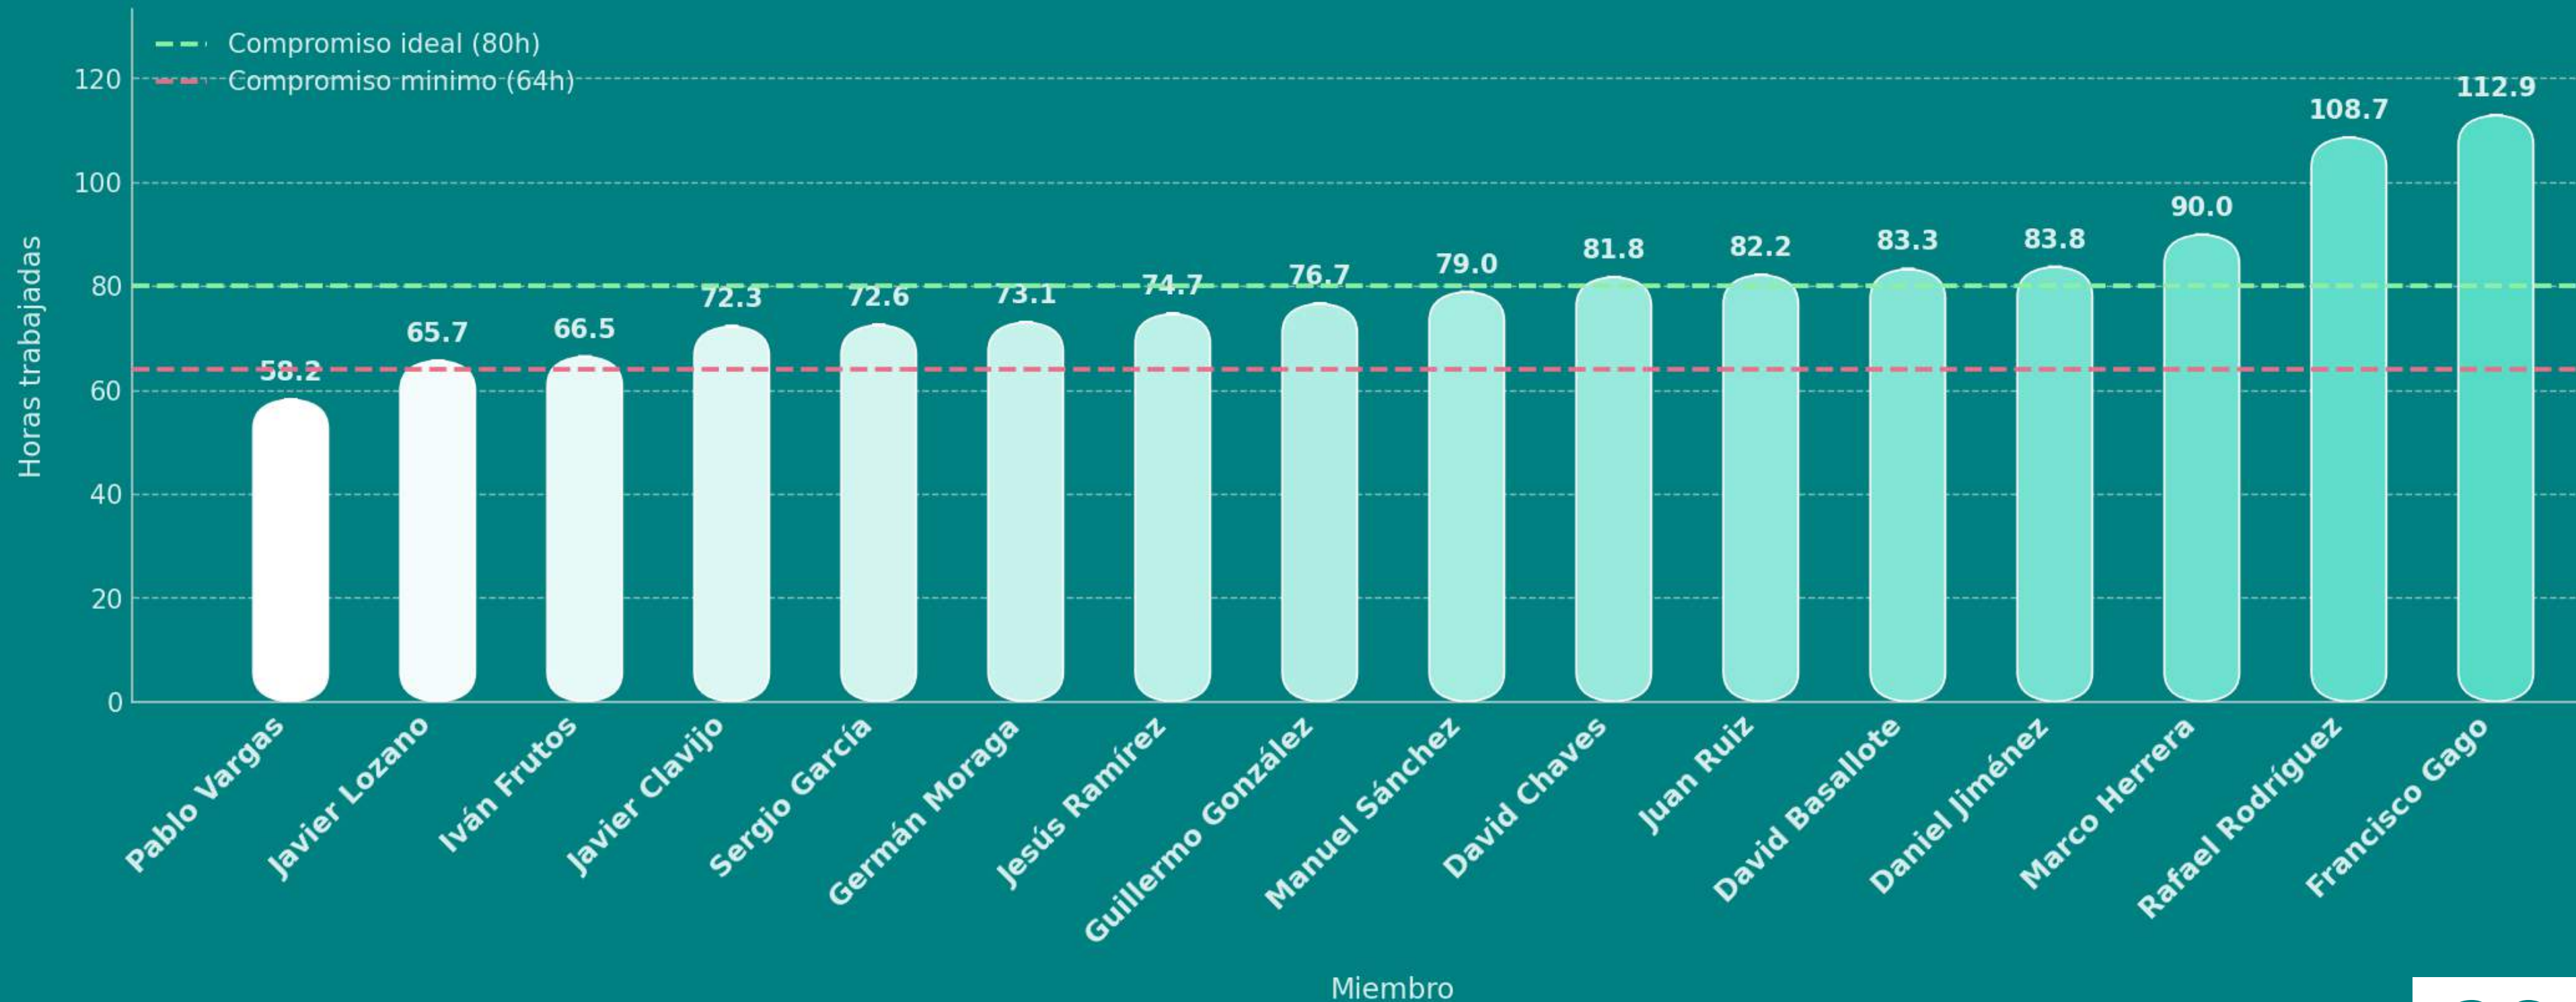

Análisis económico


Capex

68K€

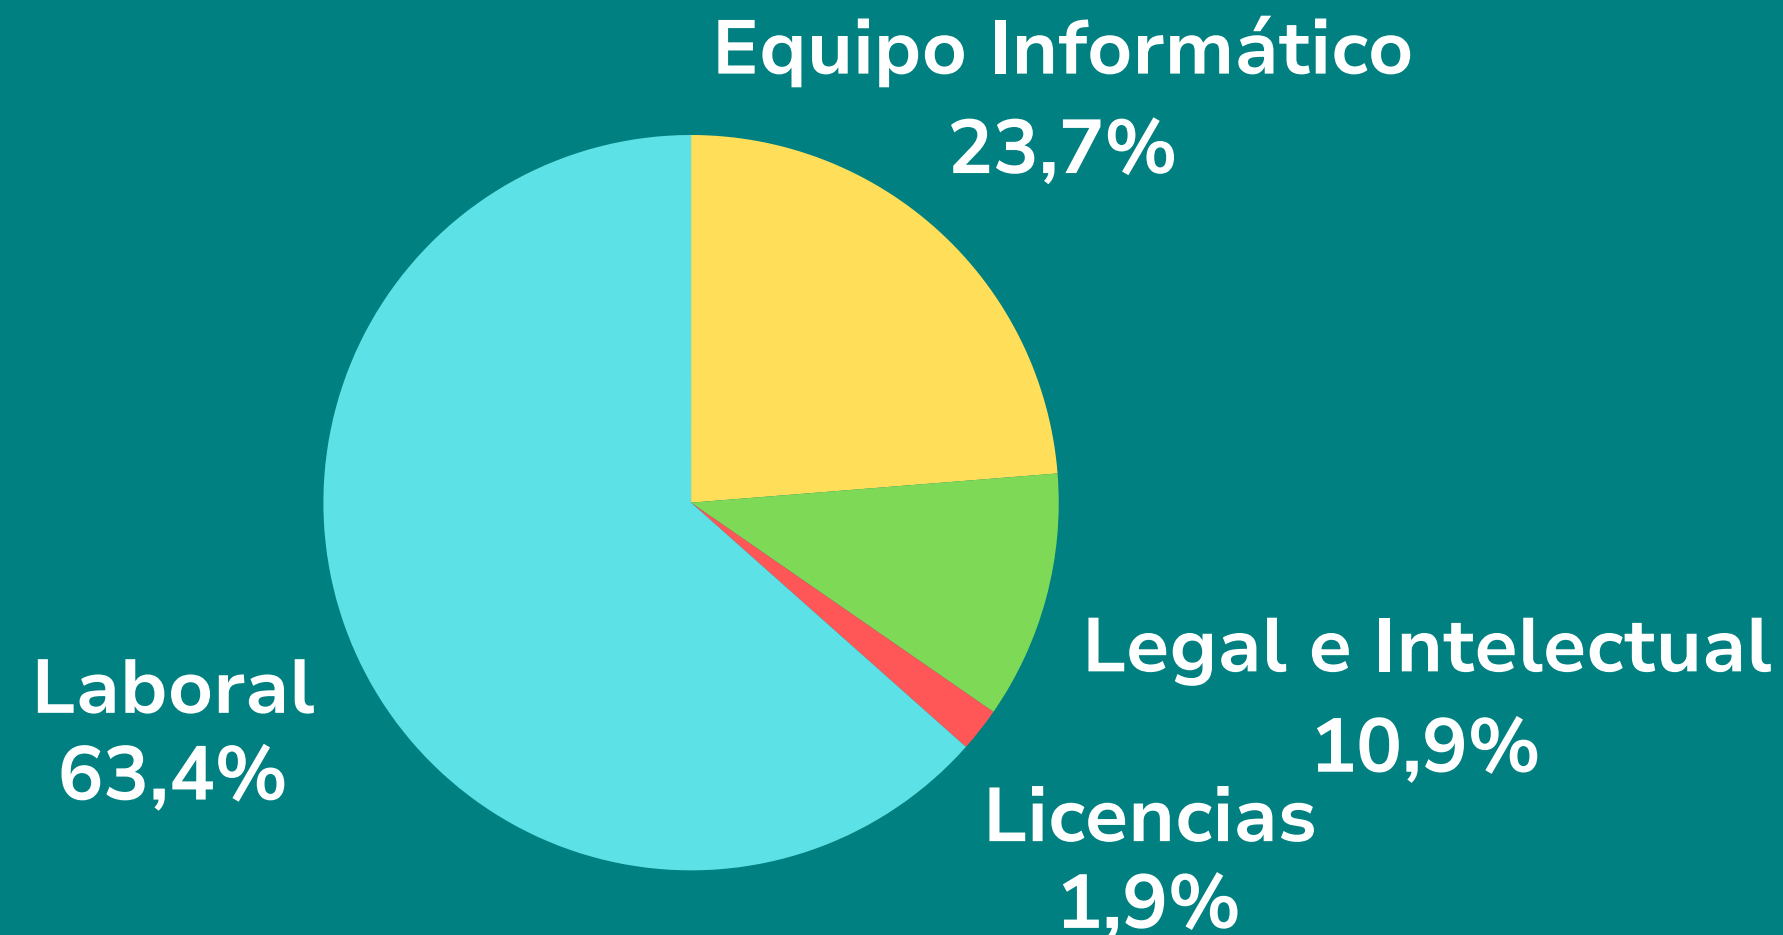

Análisis económico

Capex

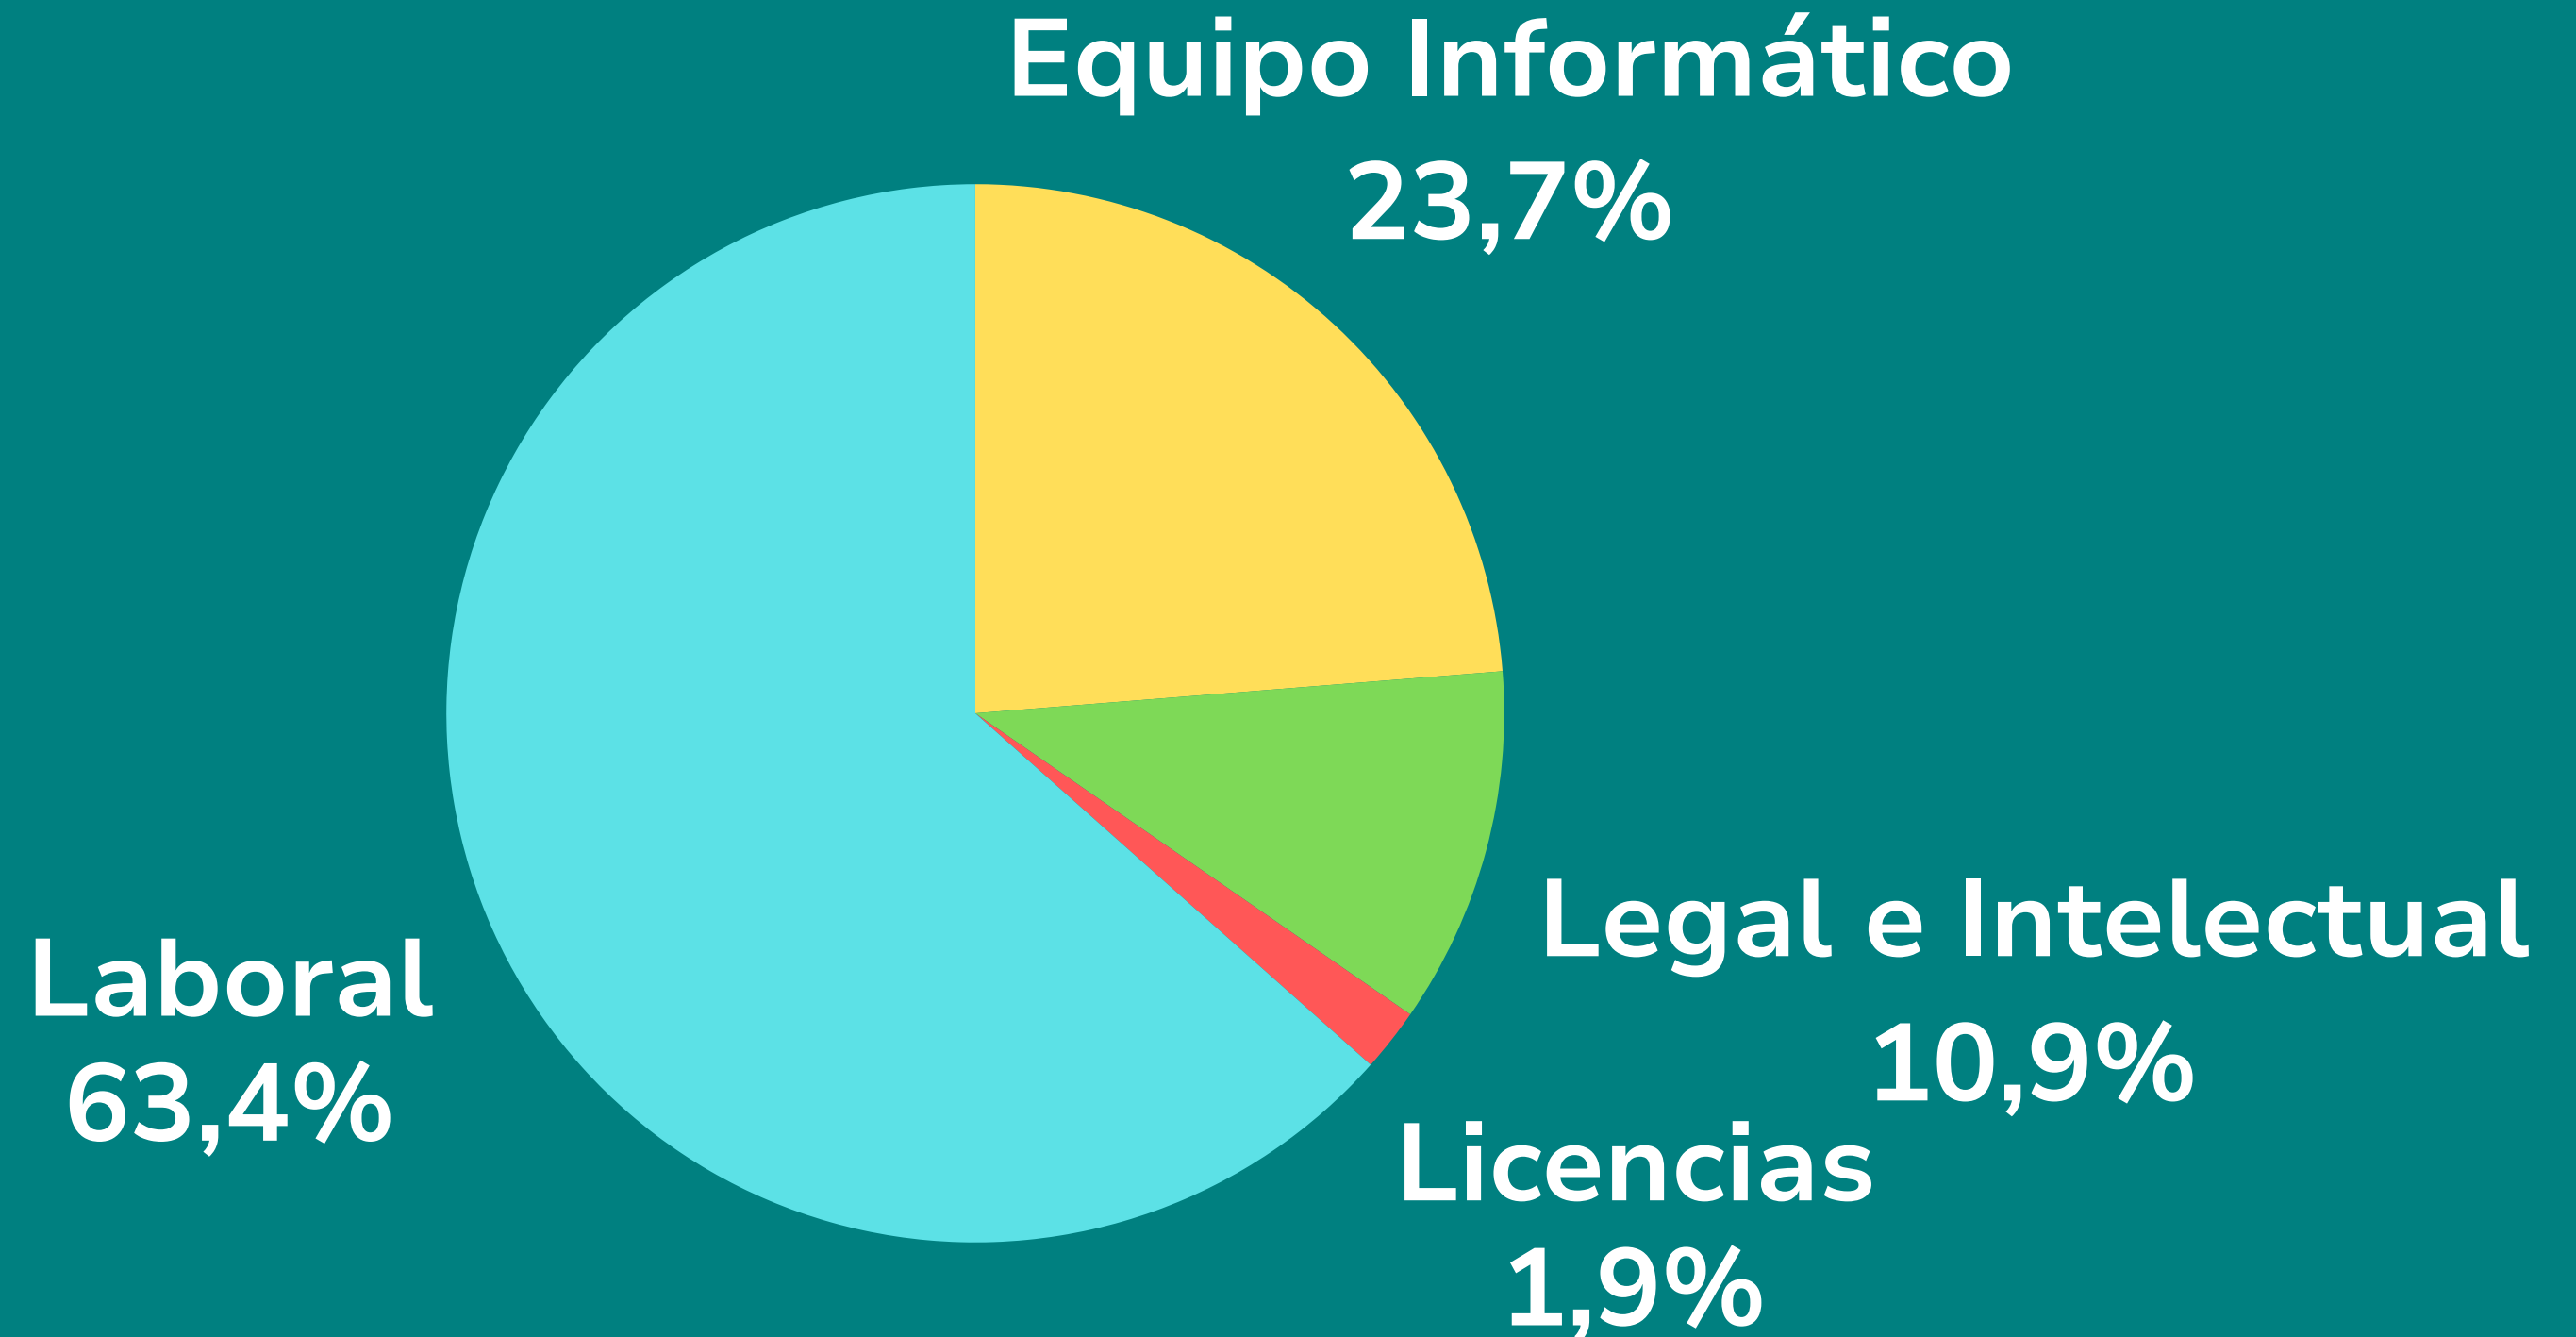

Análisis económico


Opex



Análisis económico


Opex(Desarrollo)

1K€/mes

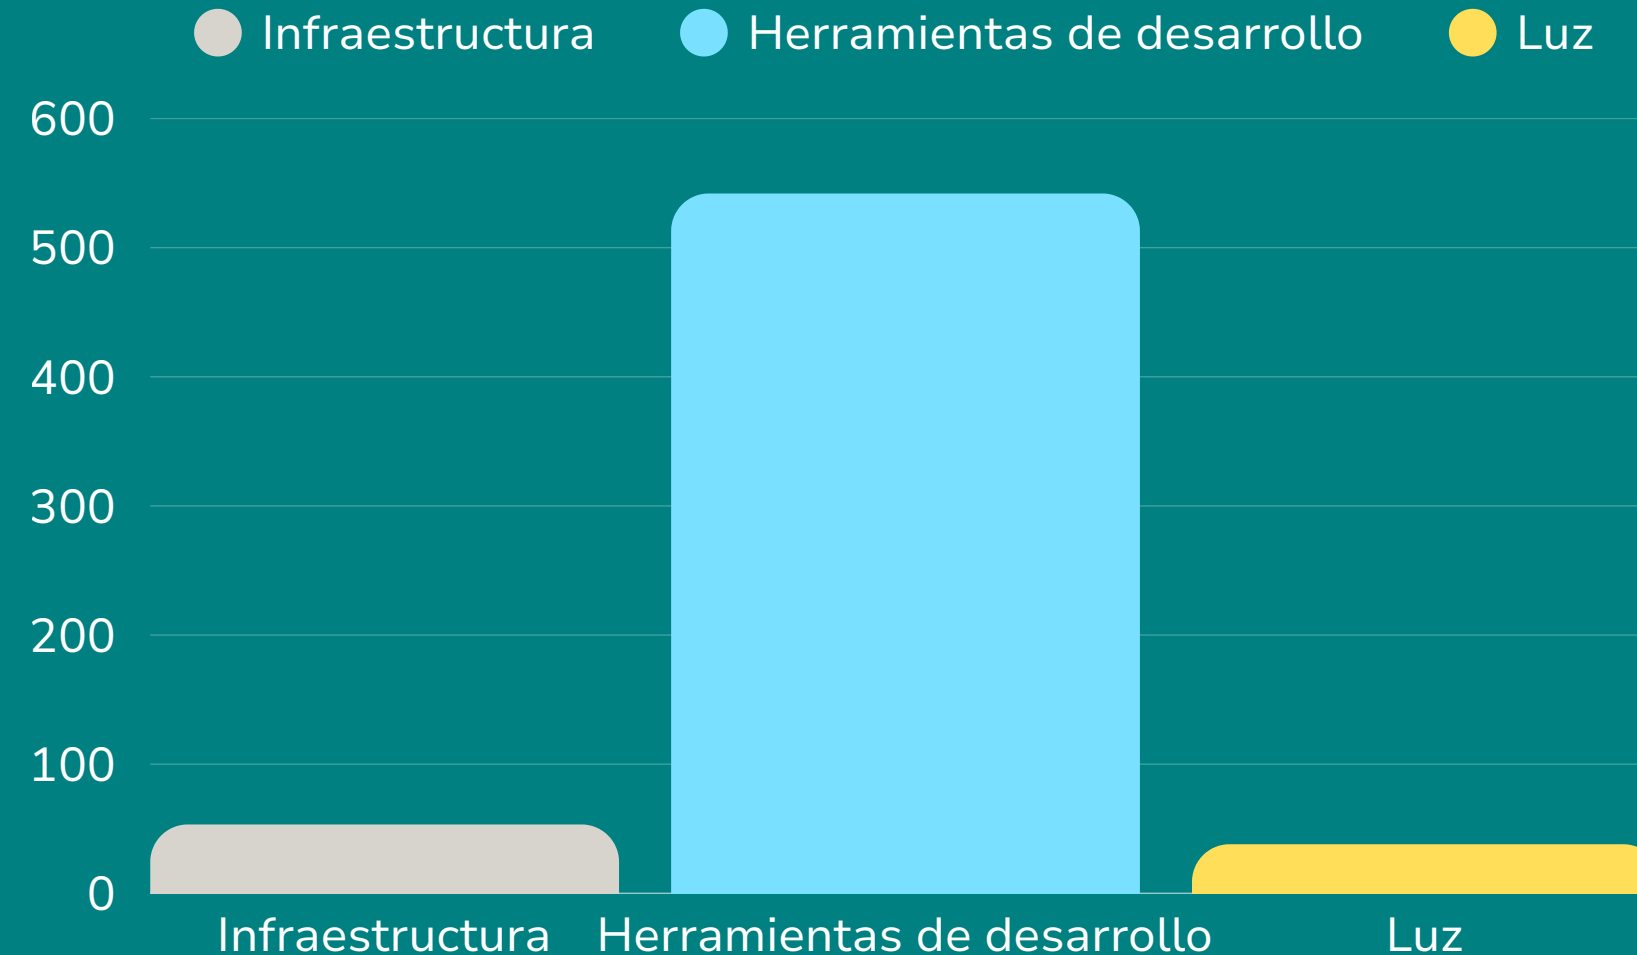

Análisis económico


Opex(Desarrollo)

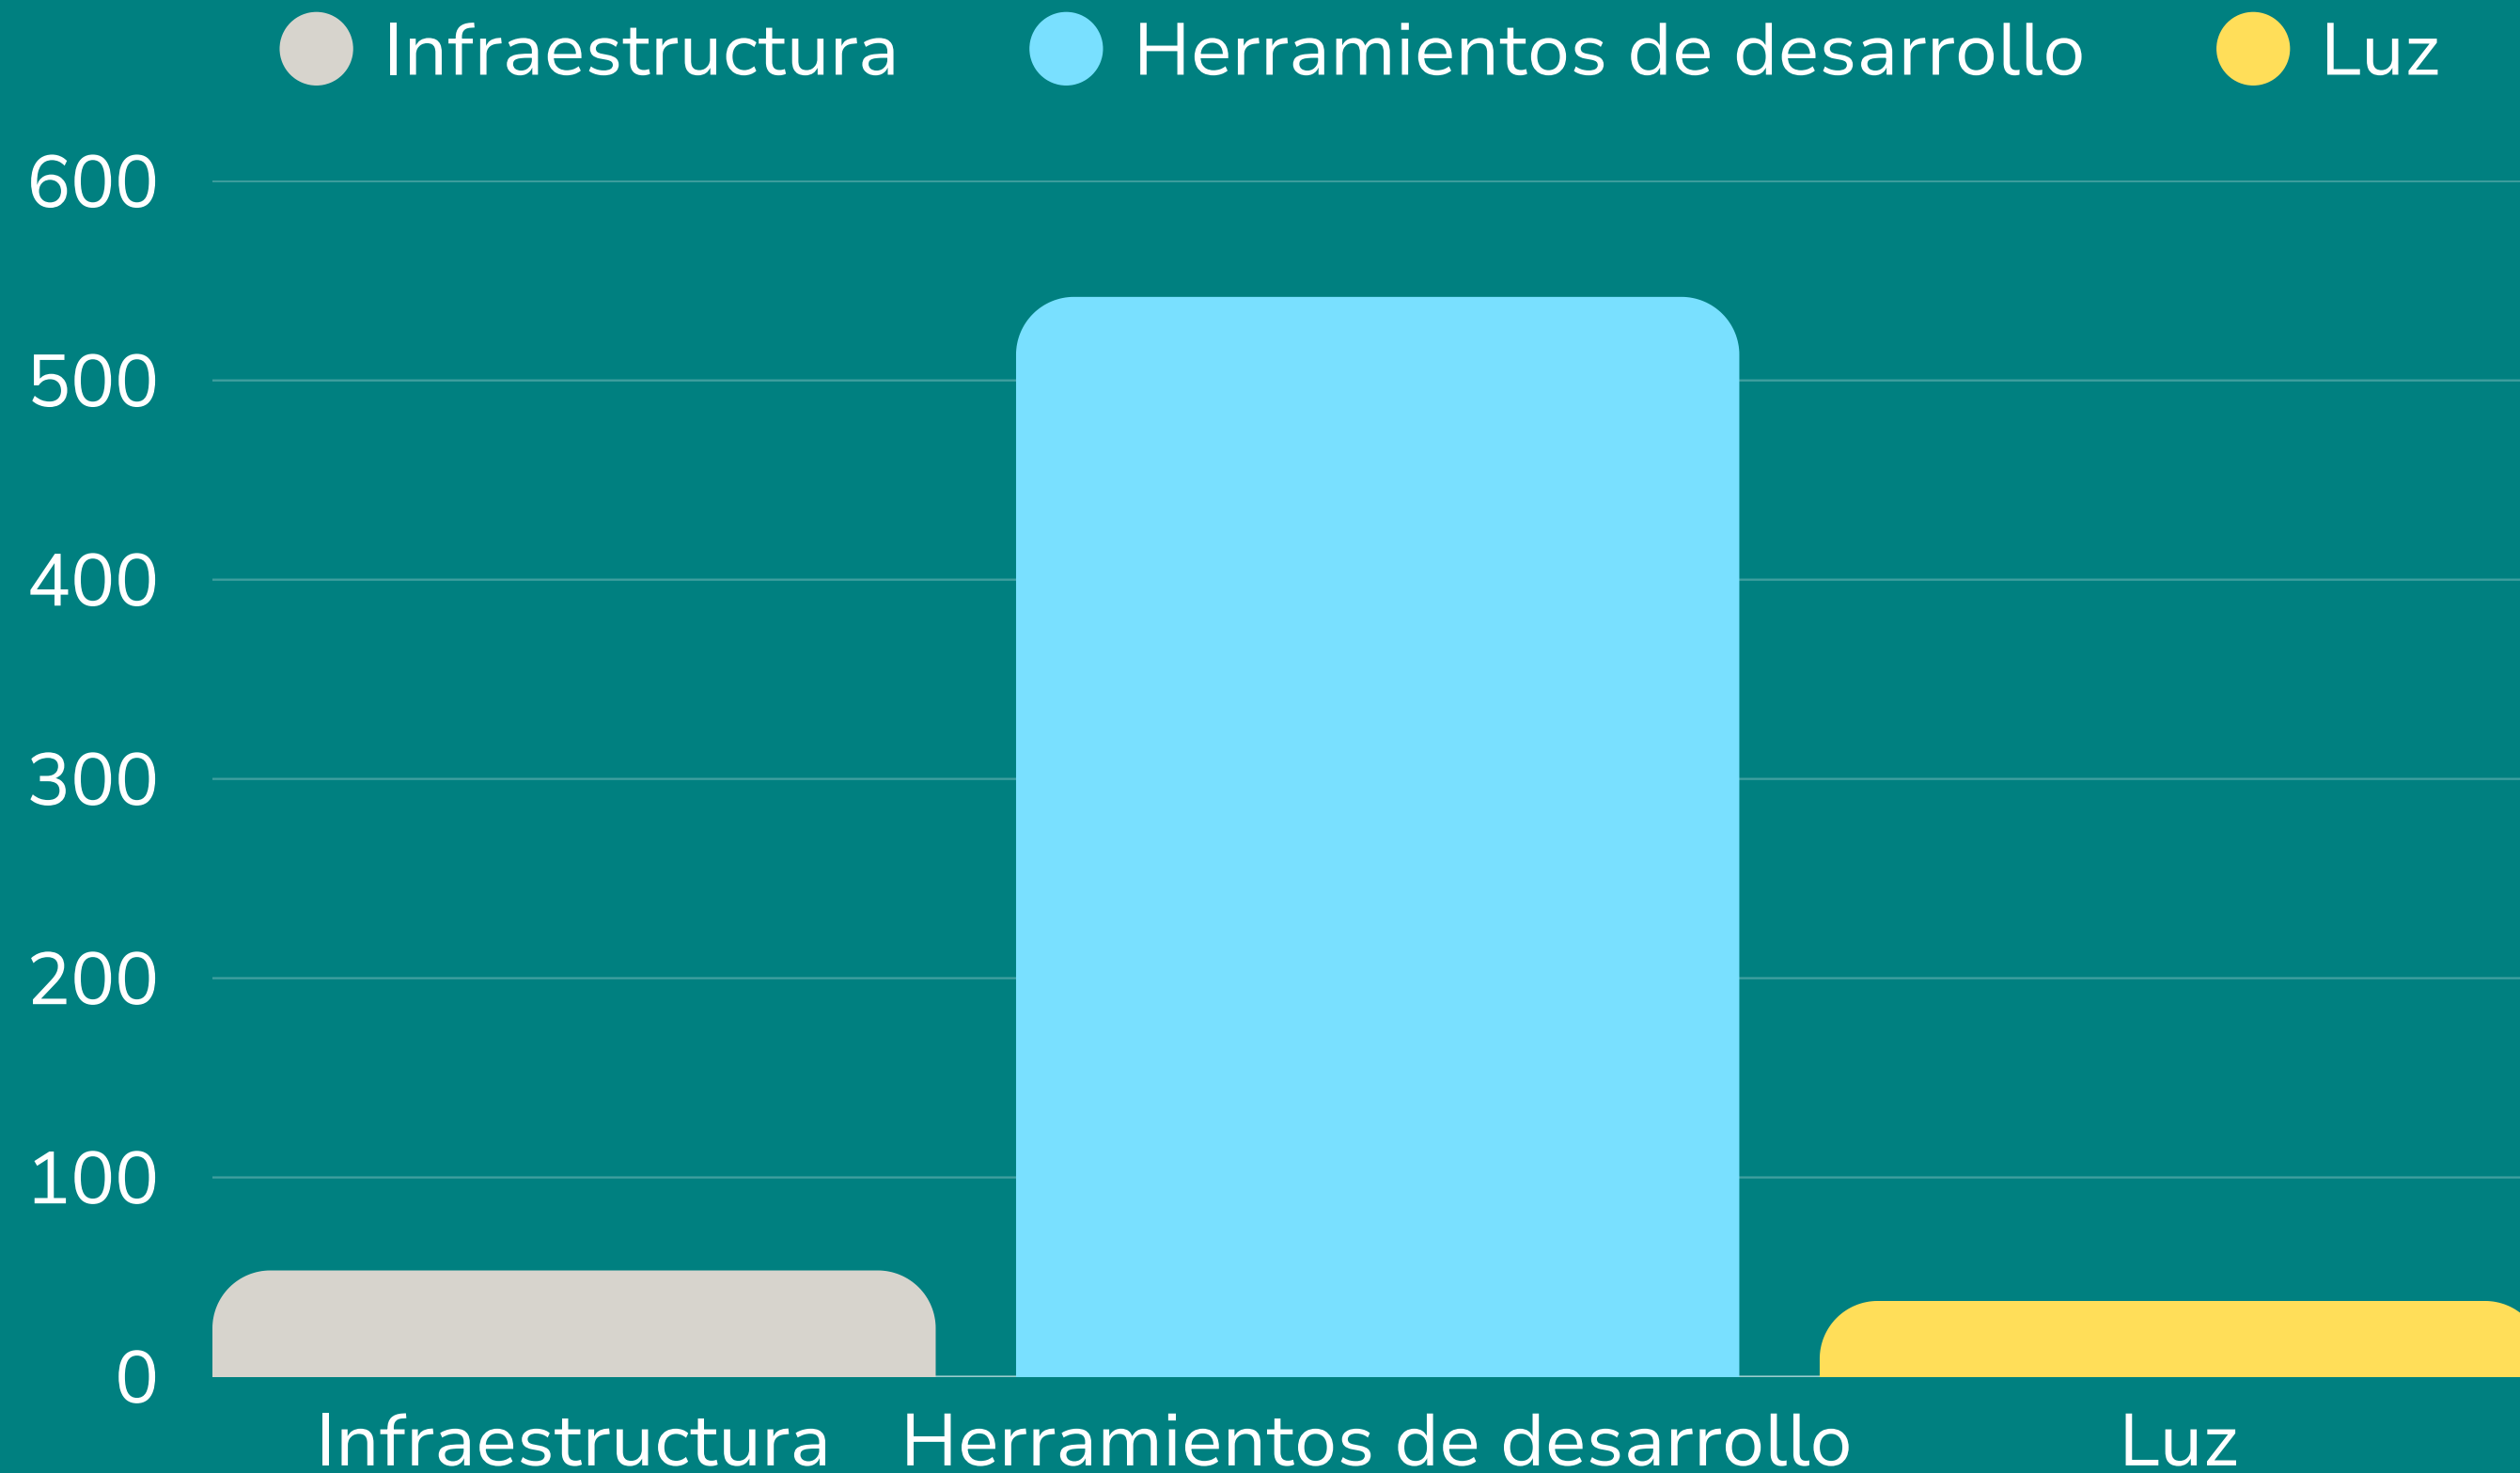

Análisis económico


Opex (Lanzamiento)

15K€/mes

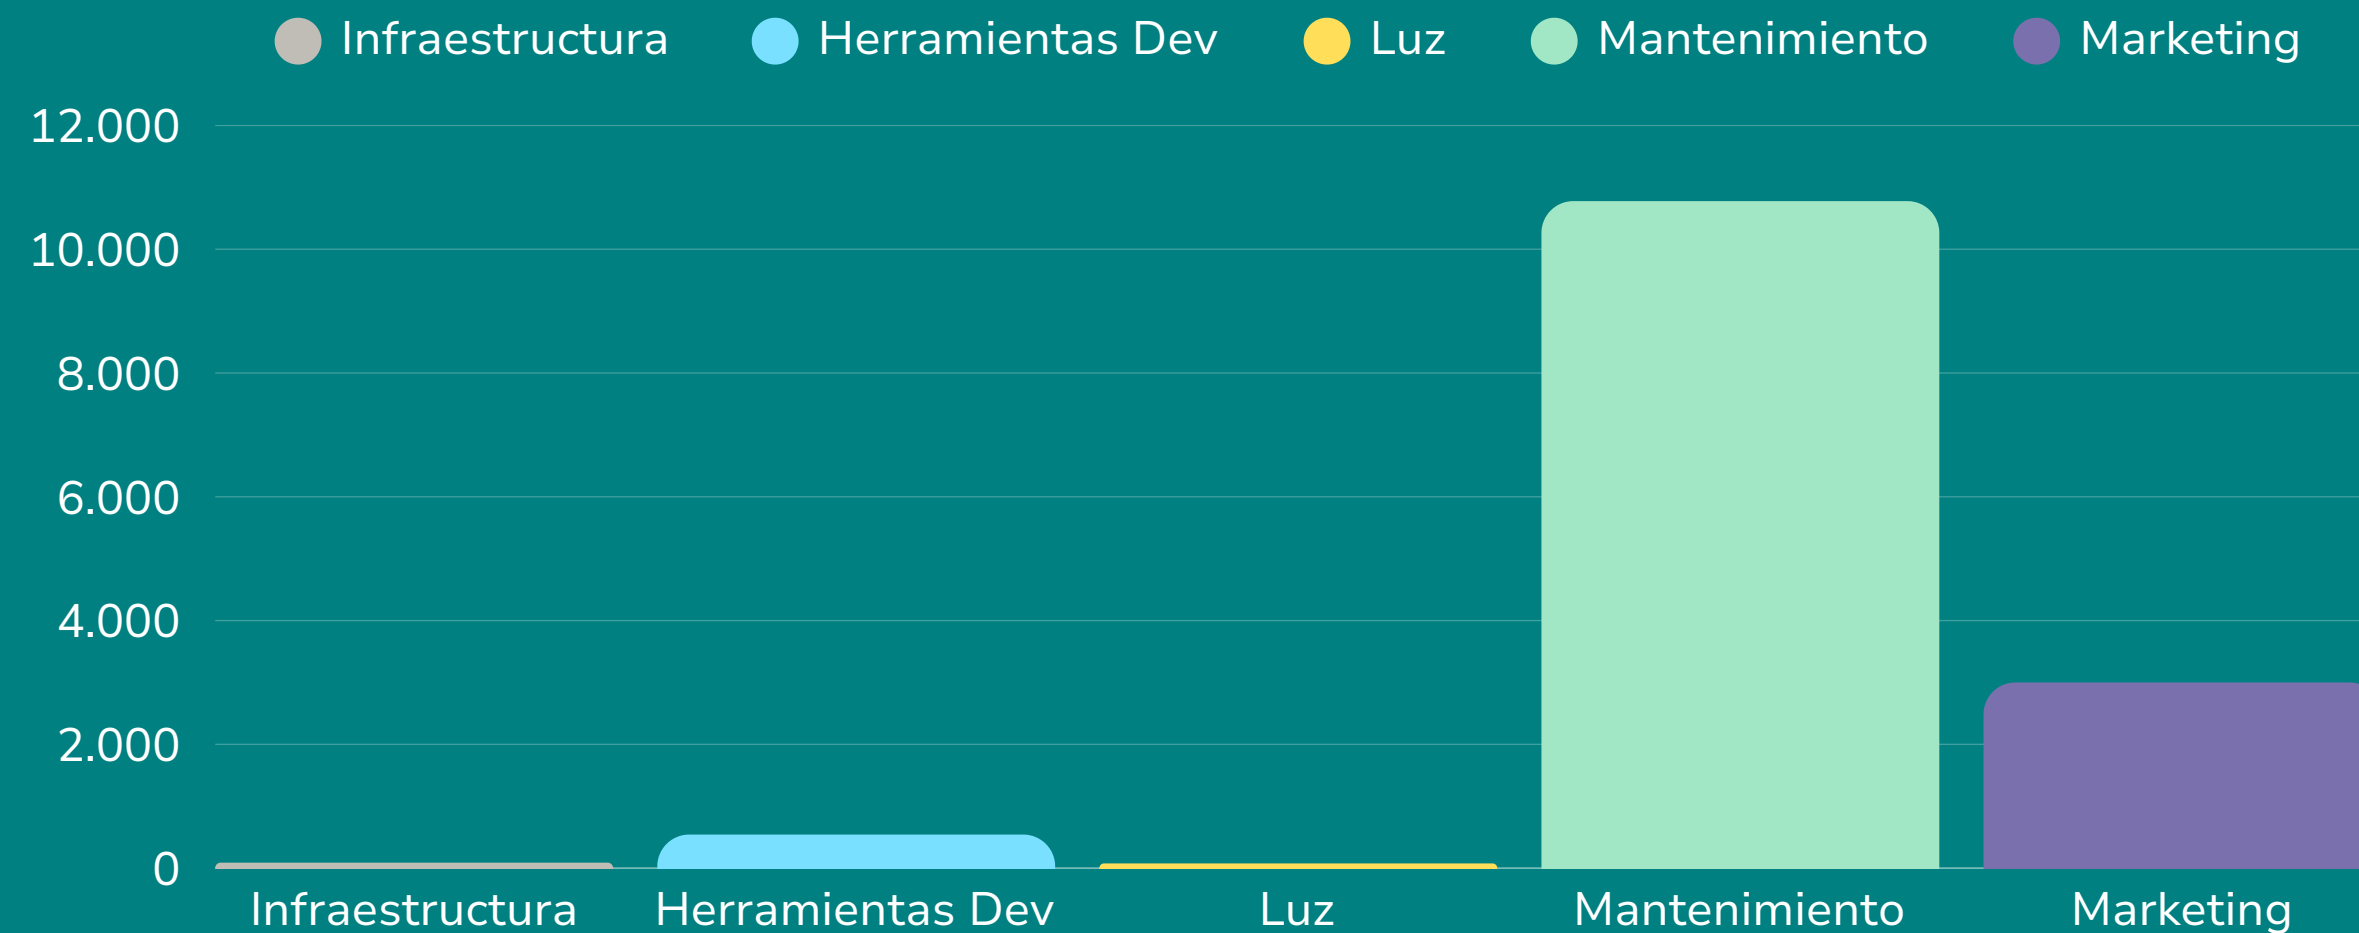


Análisis económico

Opex (Lanzamiento)

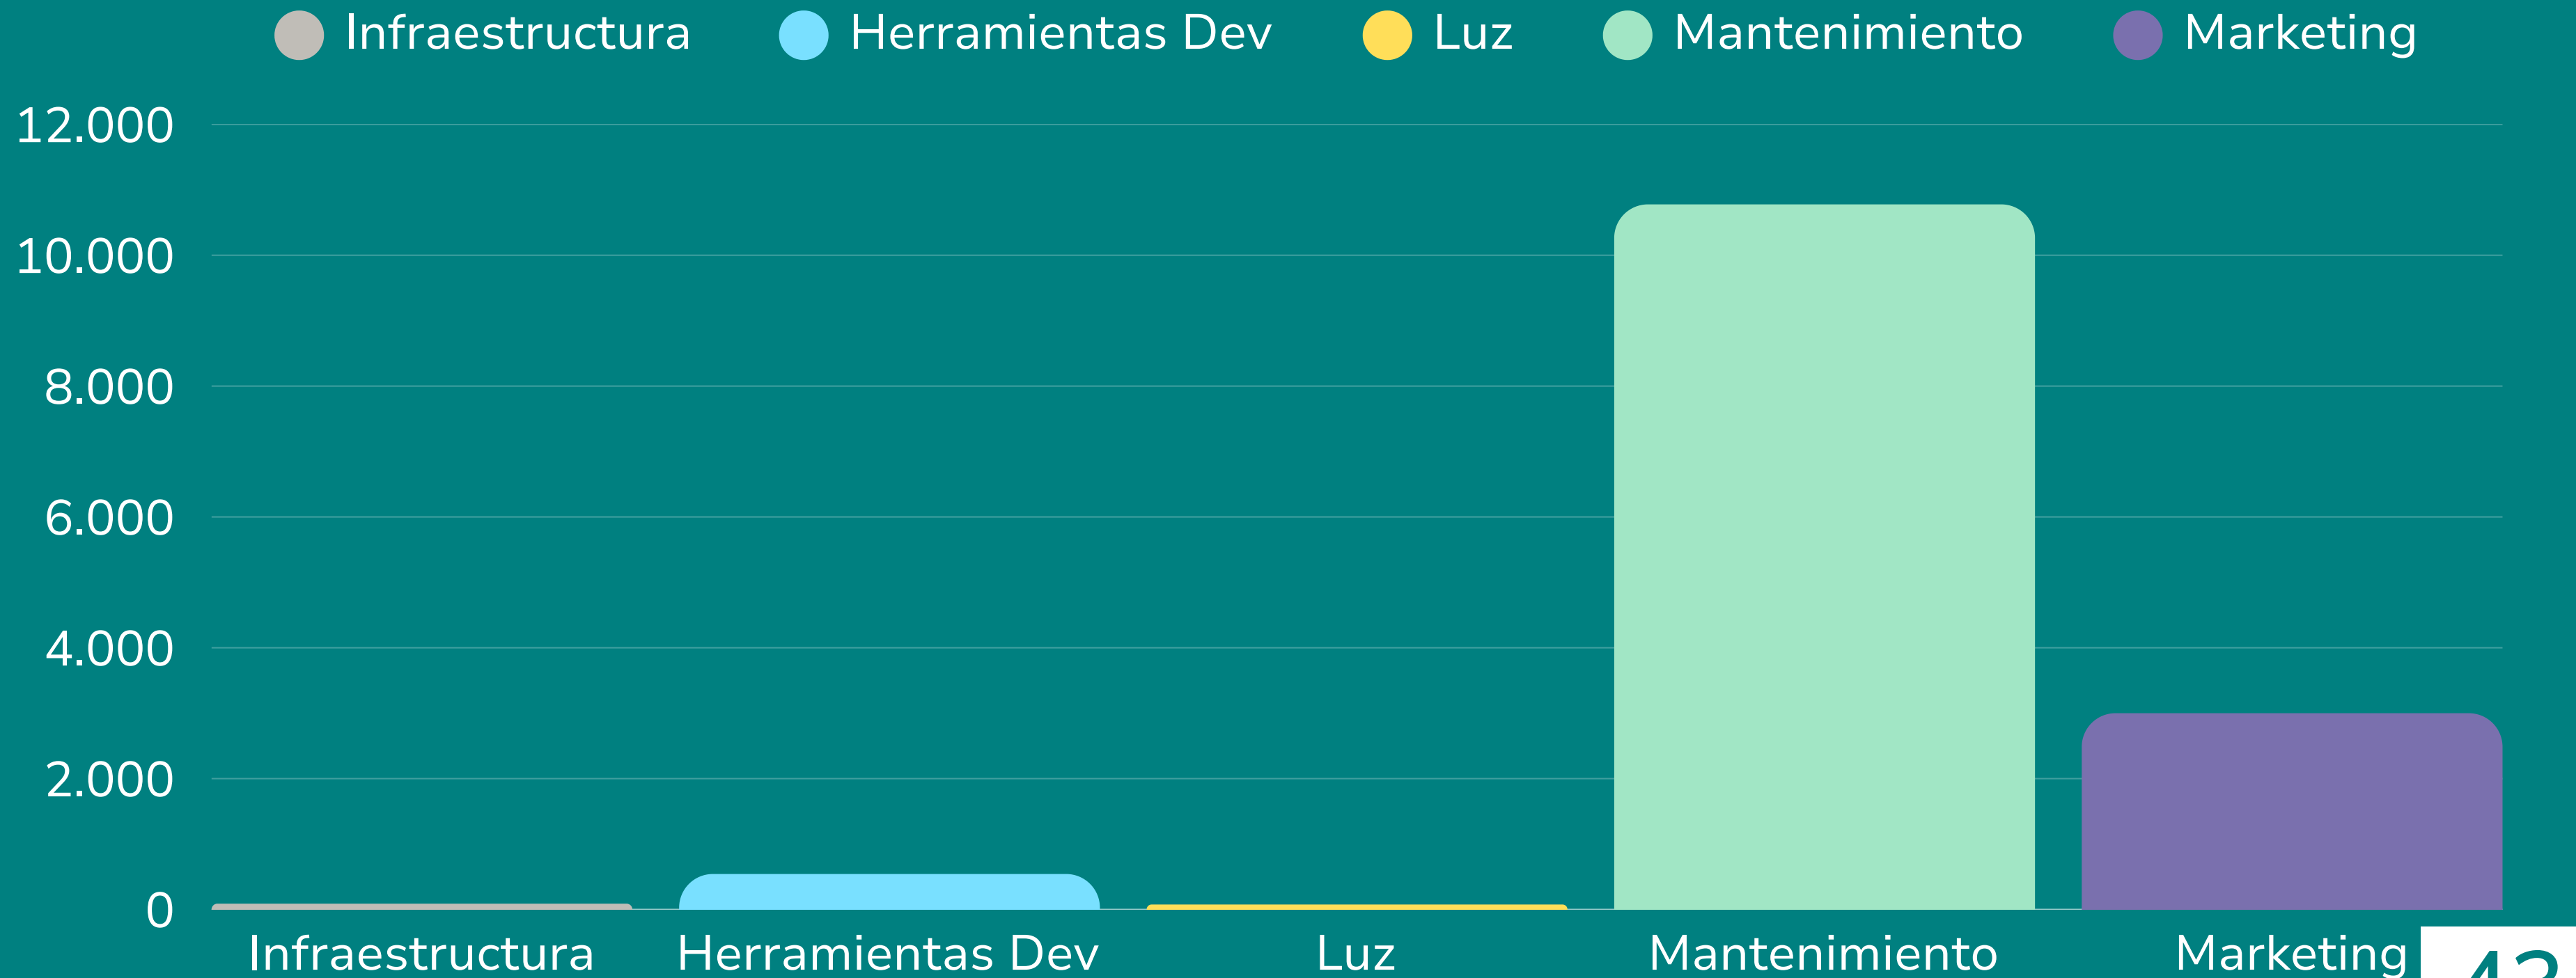

Análisis económico


Rentabilidad

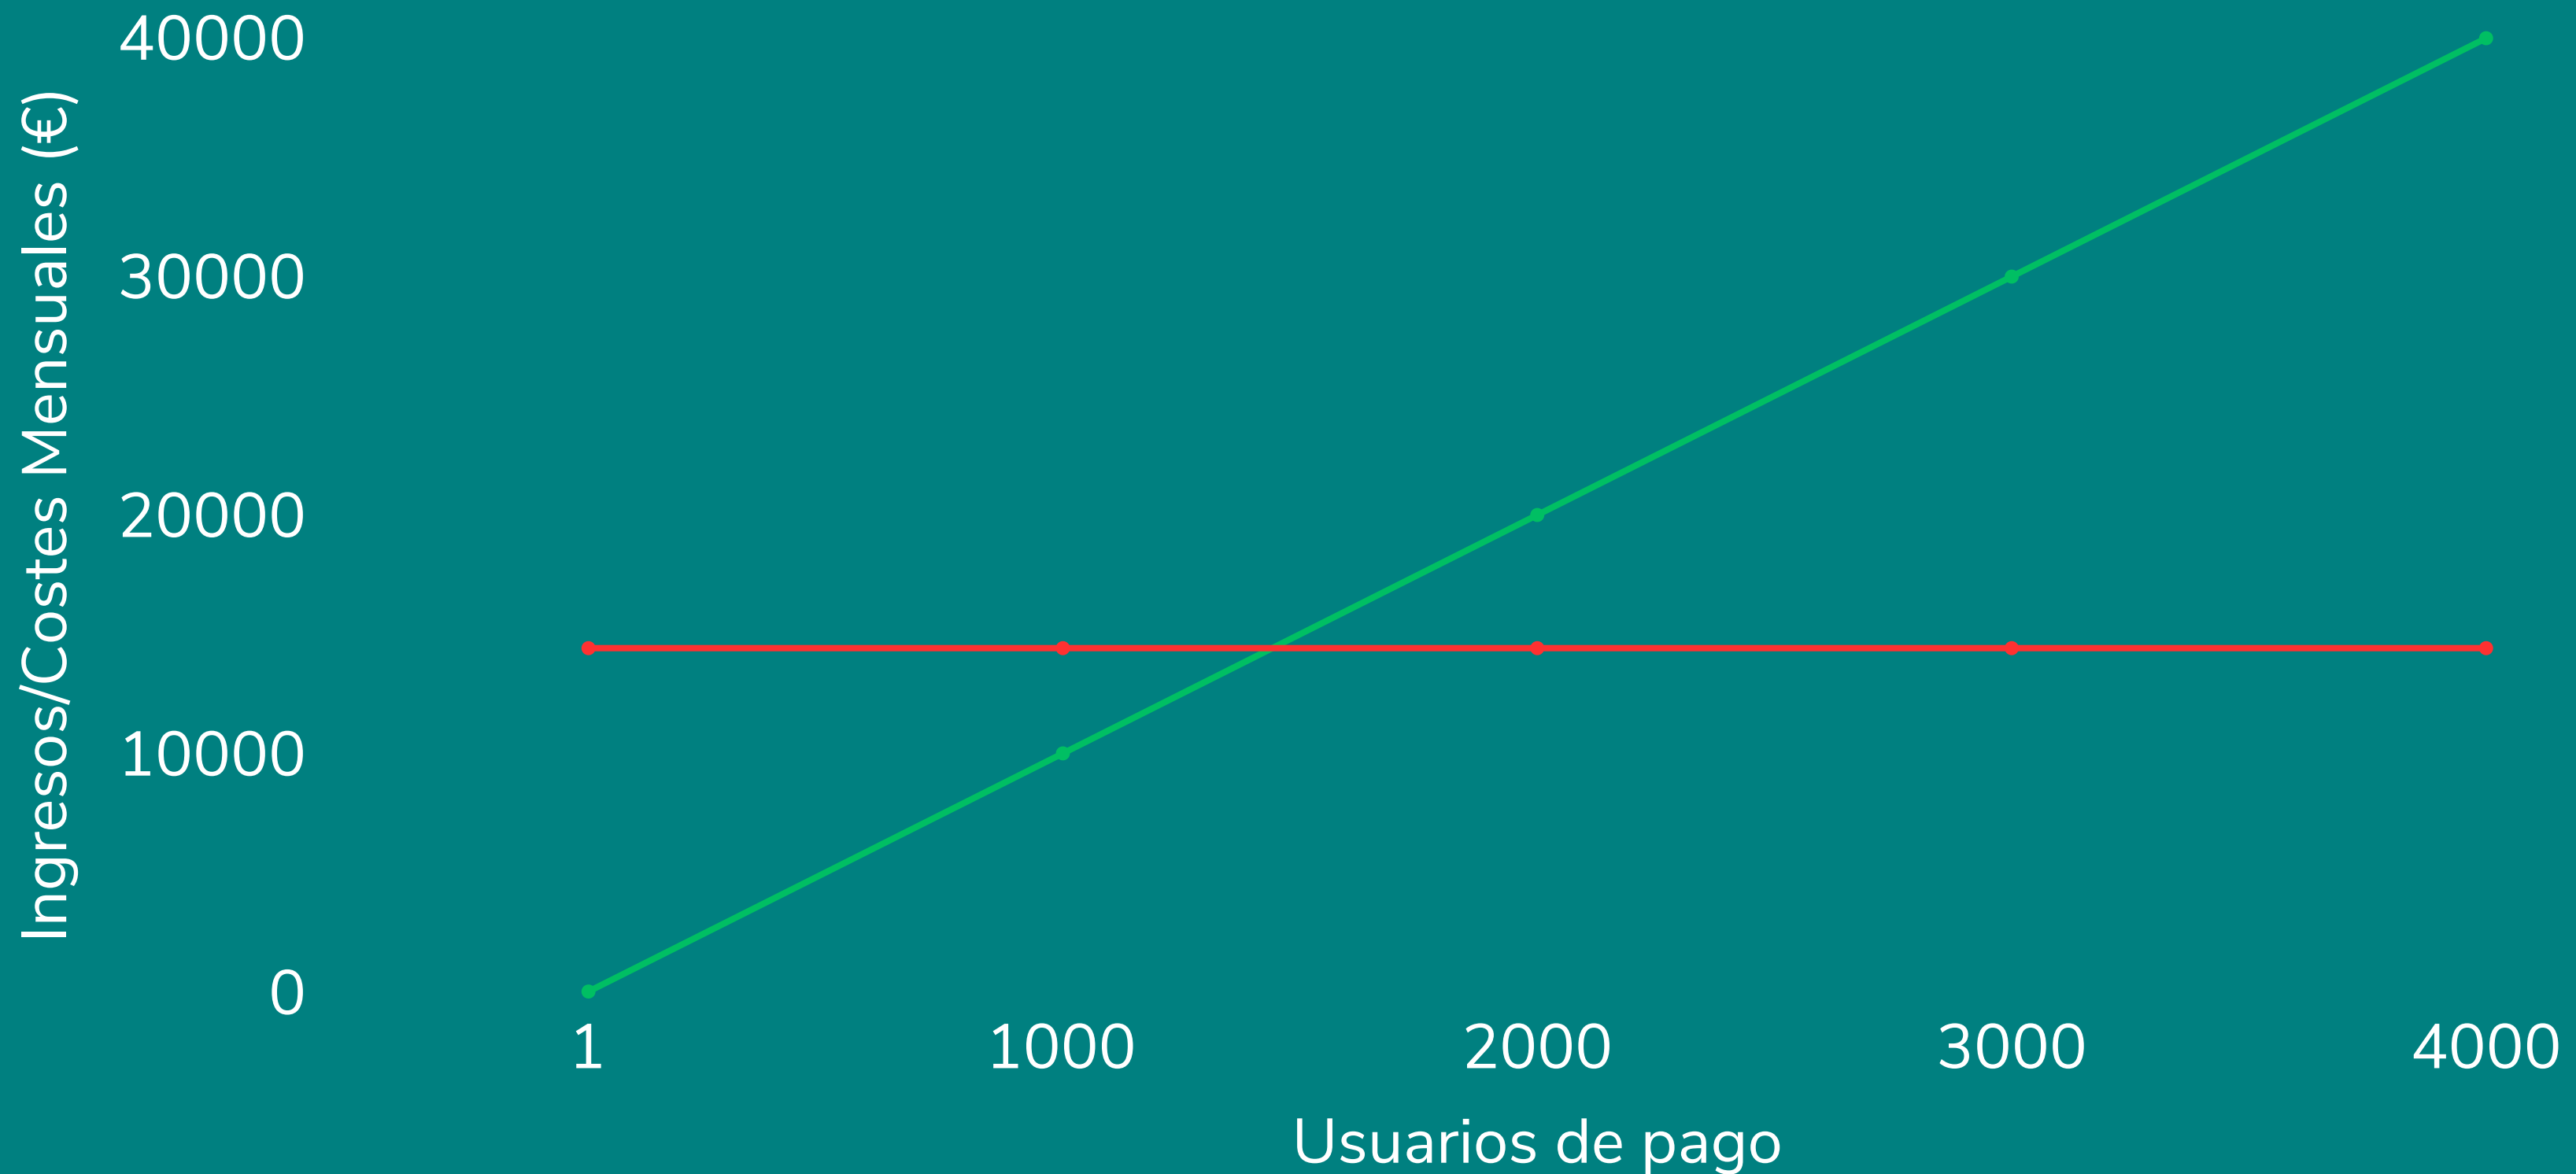

Análisis económico


Gastos hasta hoy

48K€

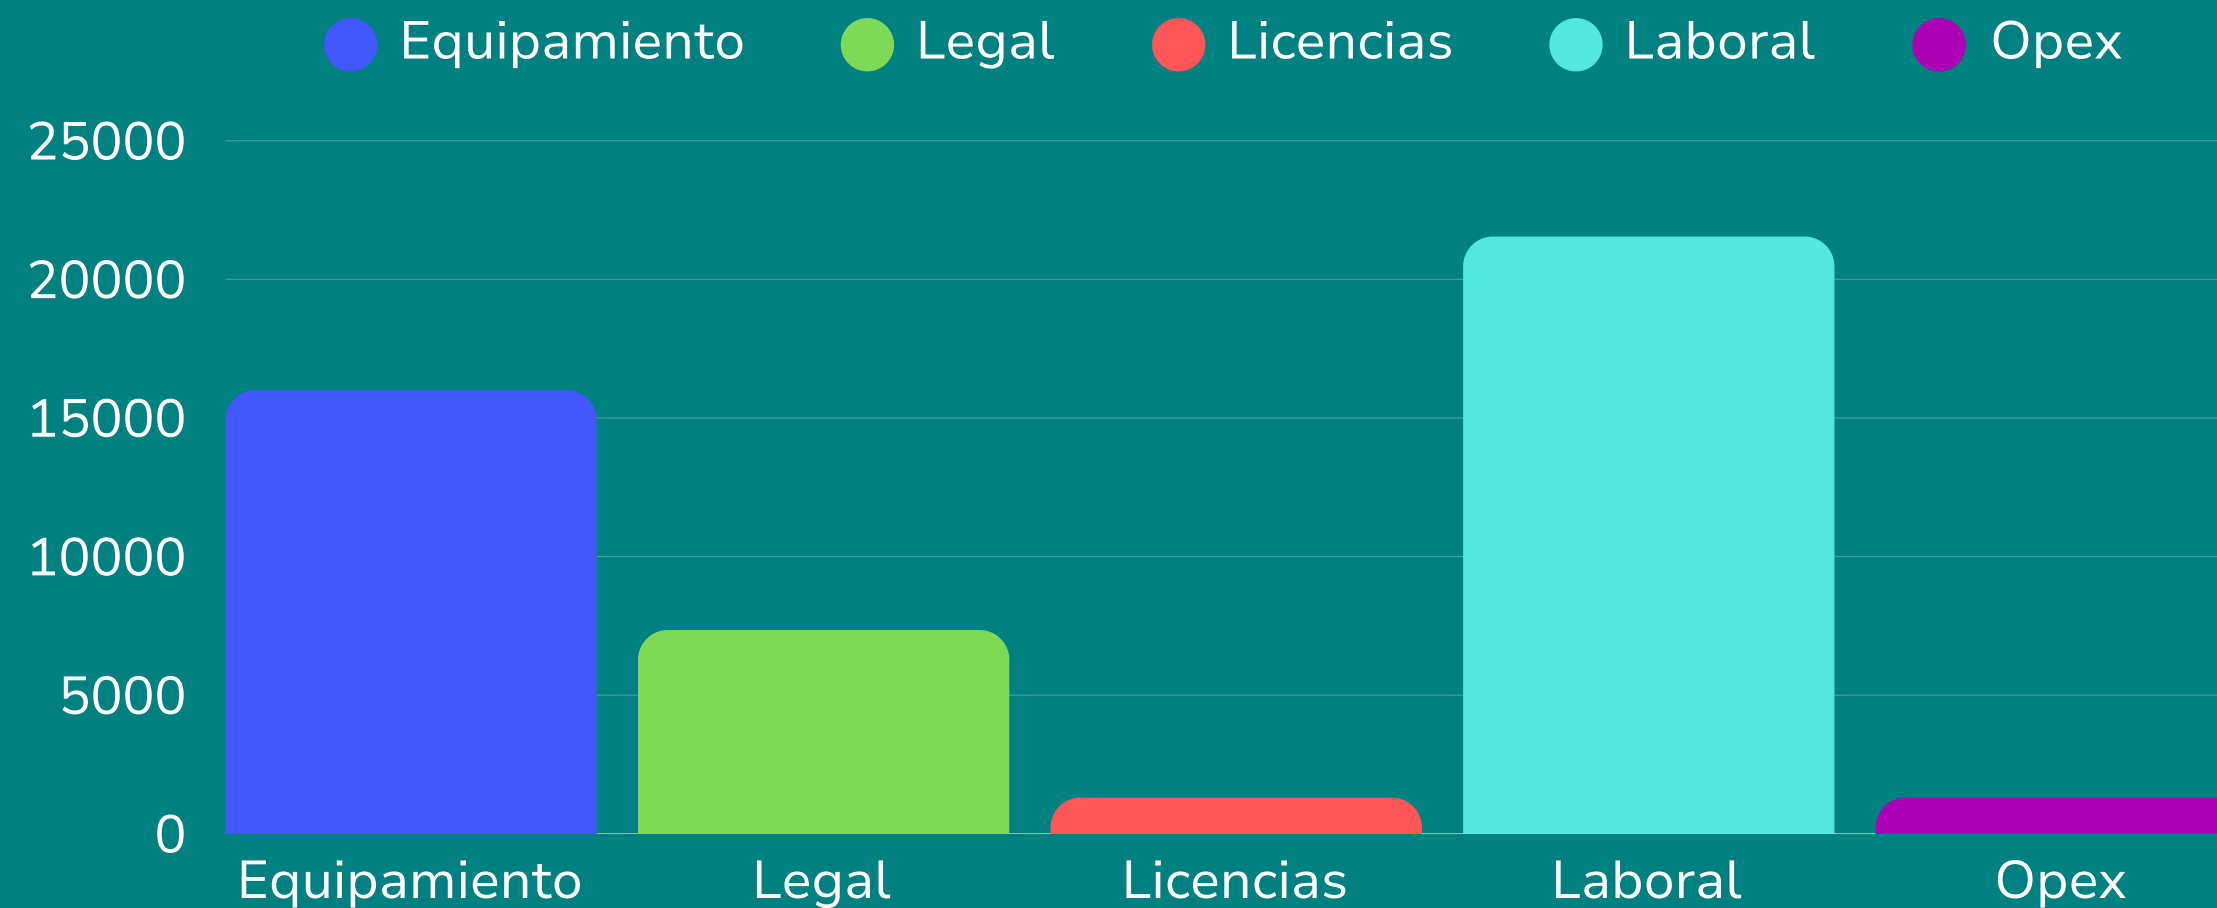

Análisis económico

Gastos hasta hoy

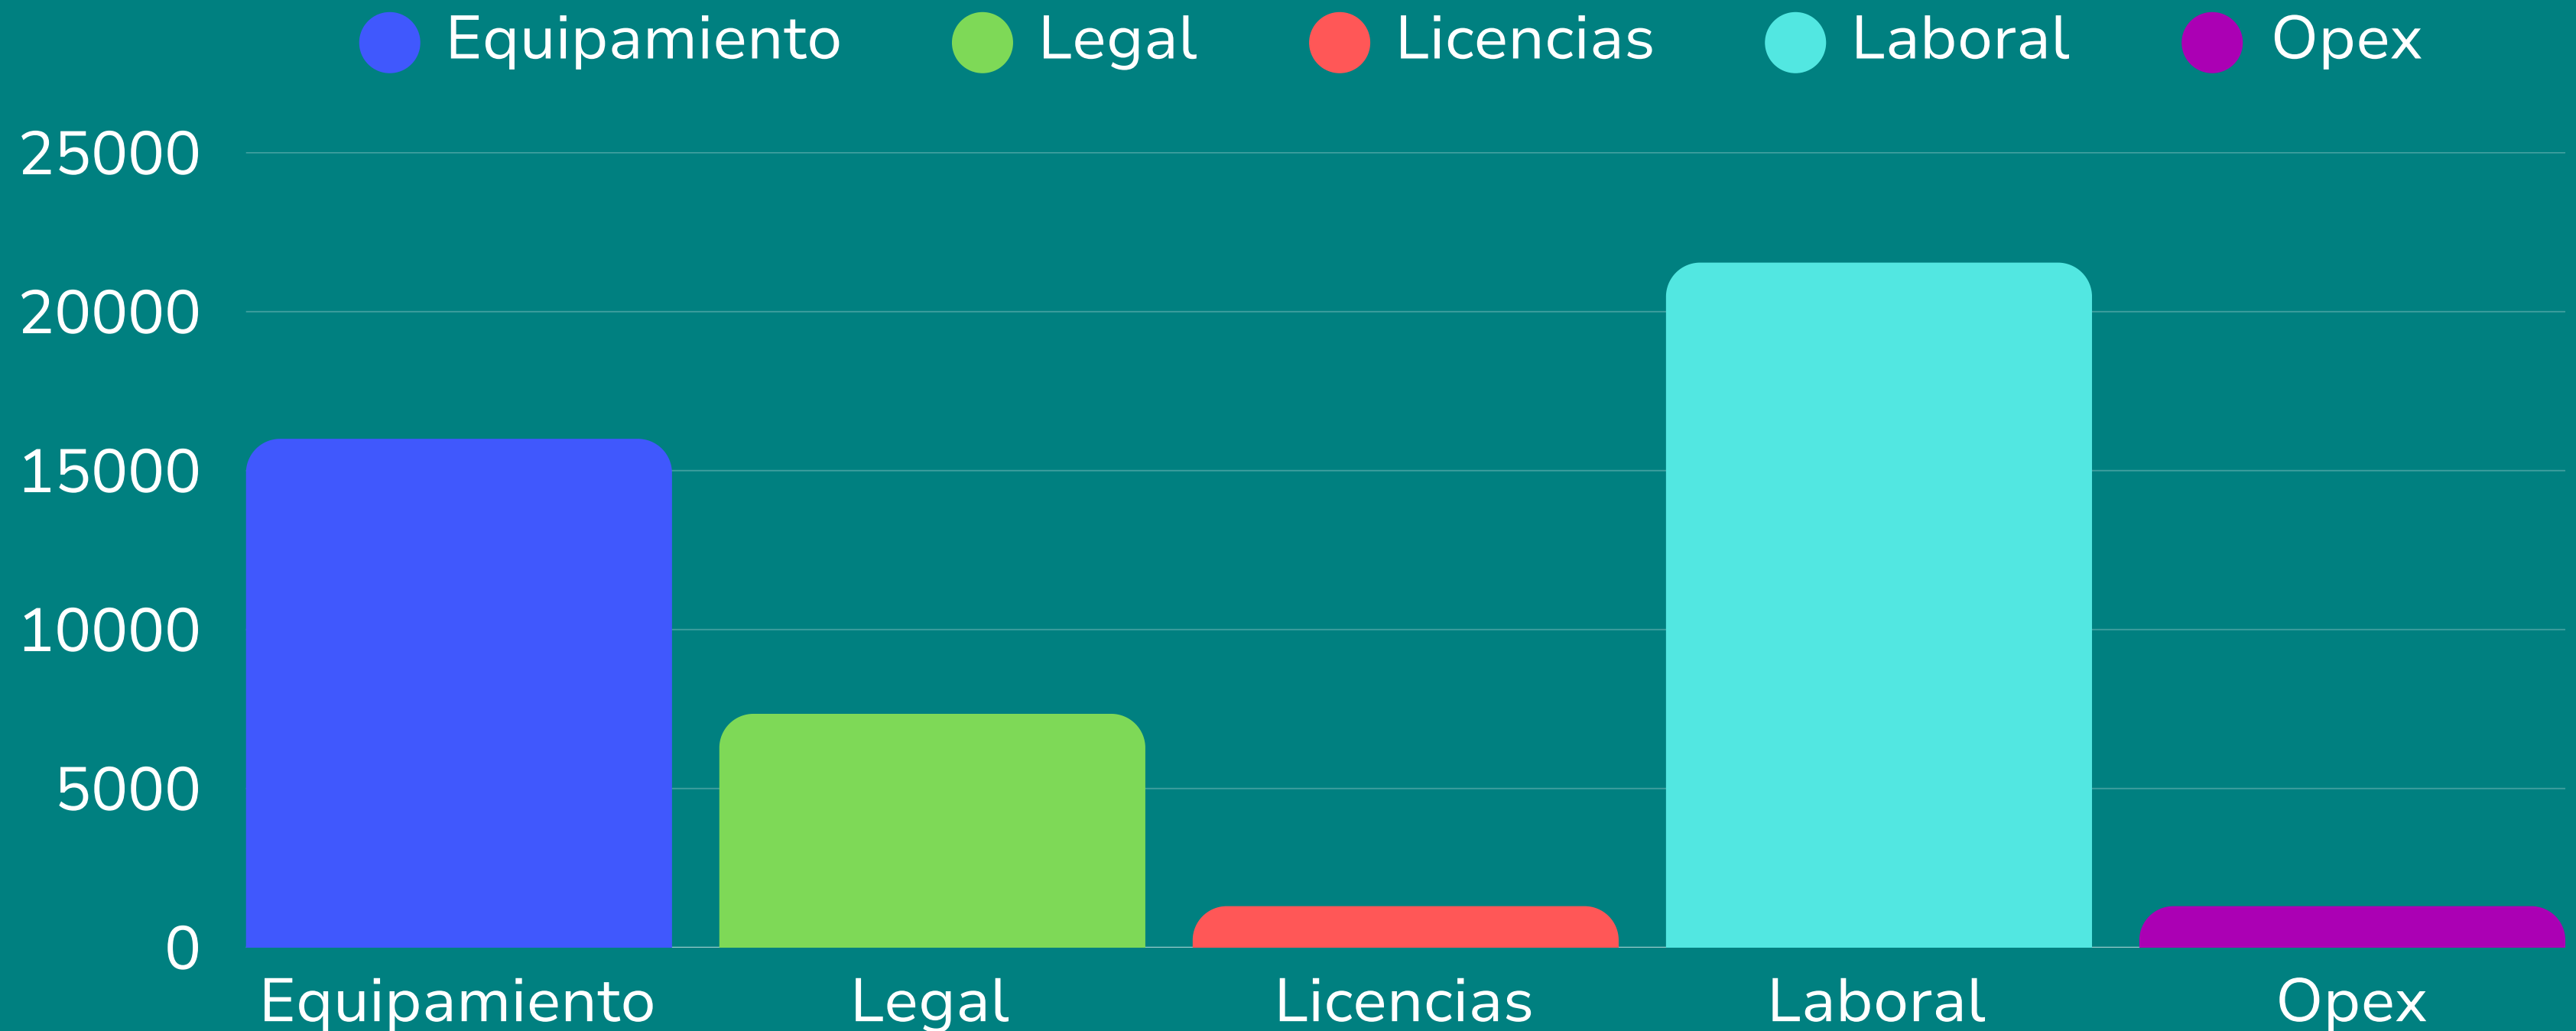

5. ¿Cómo nos ha ido?



Retrospectiva Sprint 2

Análisis de rendimiento



Retrospectiva Sprint 2

Análisis de rendimiento



Retrospectiva Sprint 2

Previsto vs realizado



SISTEMA DE
FAVORITOS



GESTIÓN DE CUENTAS
Y PERFIL
(Extensión)



GESTIÓN DE INCIDENCIAS
EN LA VIVIENDA



GESTIÓN
INMUEBLES



CHAT POST
MATCH

Retrospectiva Sprint 2

Análisis de problemas


Problema



Lecciones aprendidas



Mitigaciones

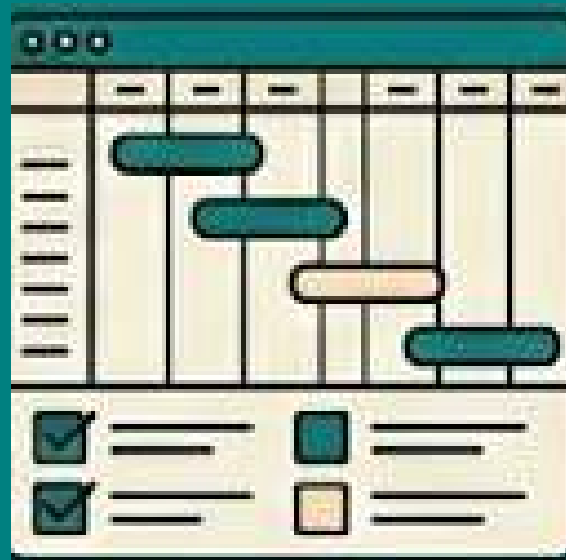

Comprobación




Retrospectiva Sprint 2

Análisis de problemas

Problema



Lecciones aprendidas

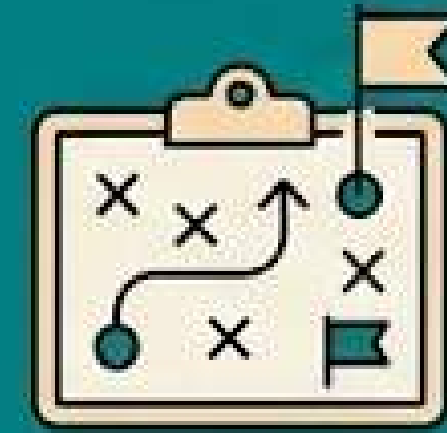

Mitigaciones



Comprobación



Retrospectiva Sprint 2

Análisis de problemas

Problema



Lecciones aprendidas



Mitigaciones



Comprobación



Retrospectiva Sprint 2

Análisis de problemas


Problema



Lecciones aprendidas



Mitigaciones




Comprobación




Retrospectiva Sprint 2

Deadlines completados

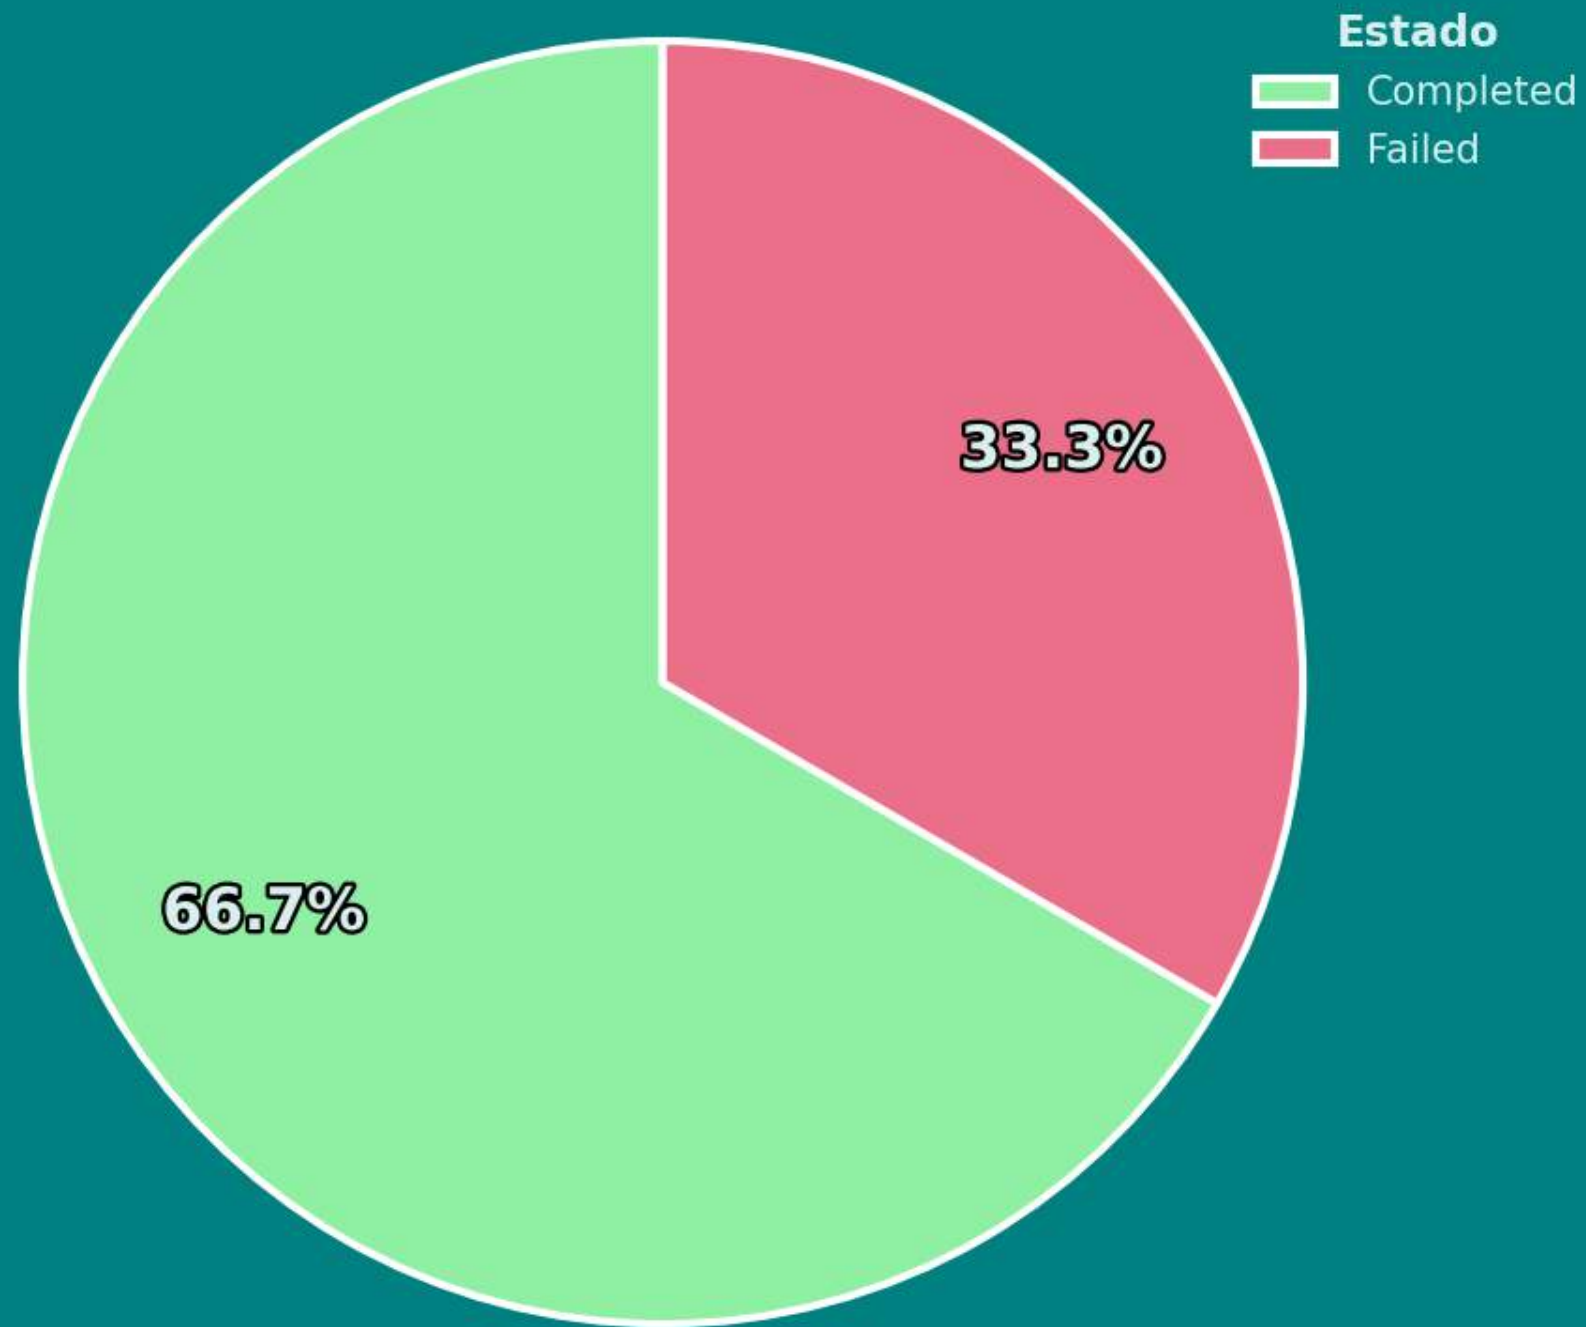

Fecha real de cierre vs. Fecha objetivo

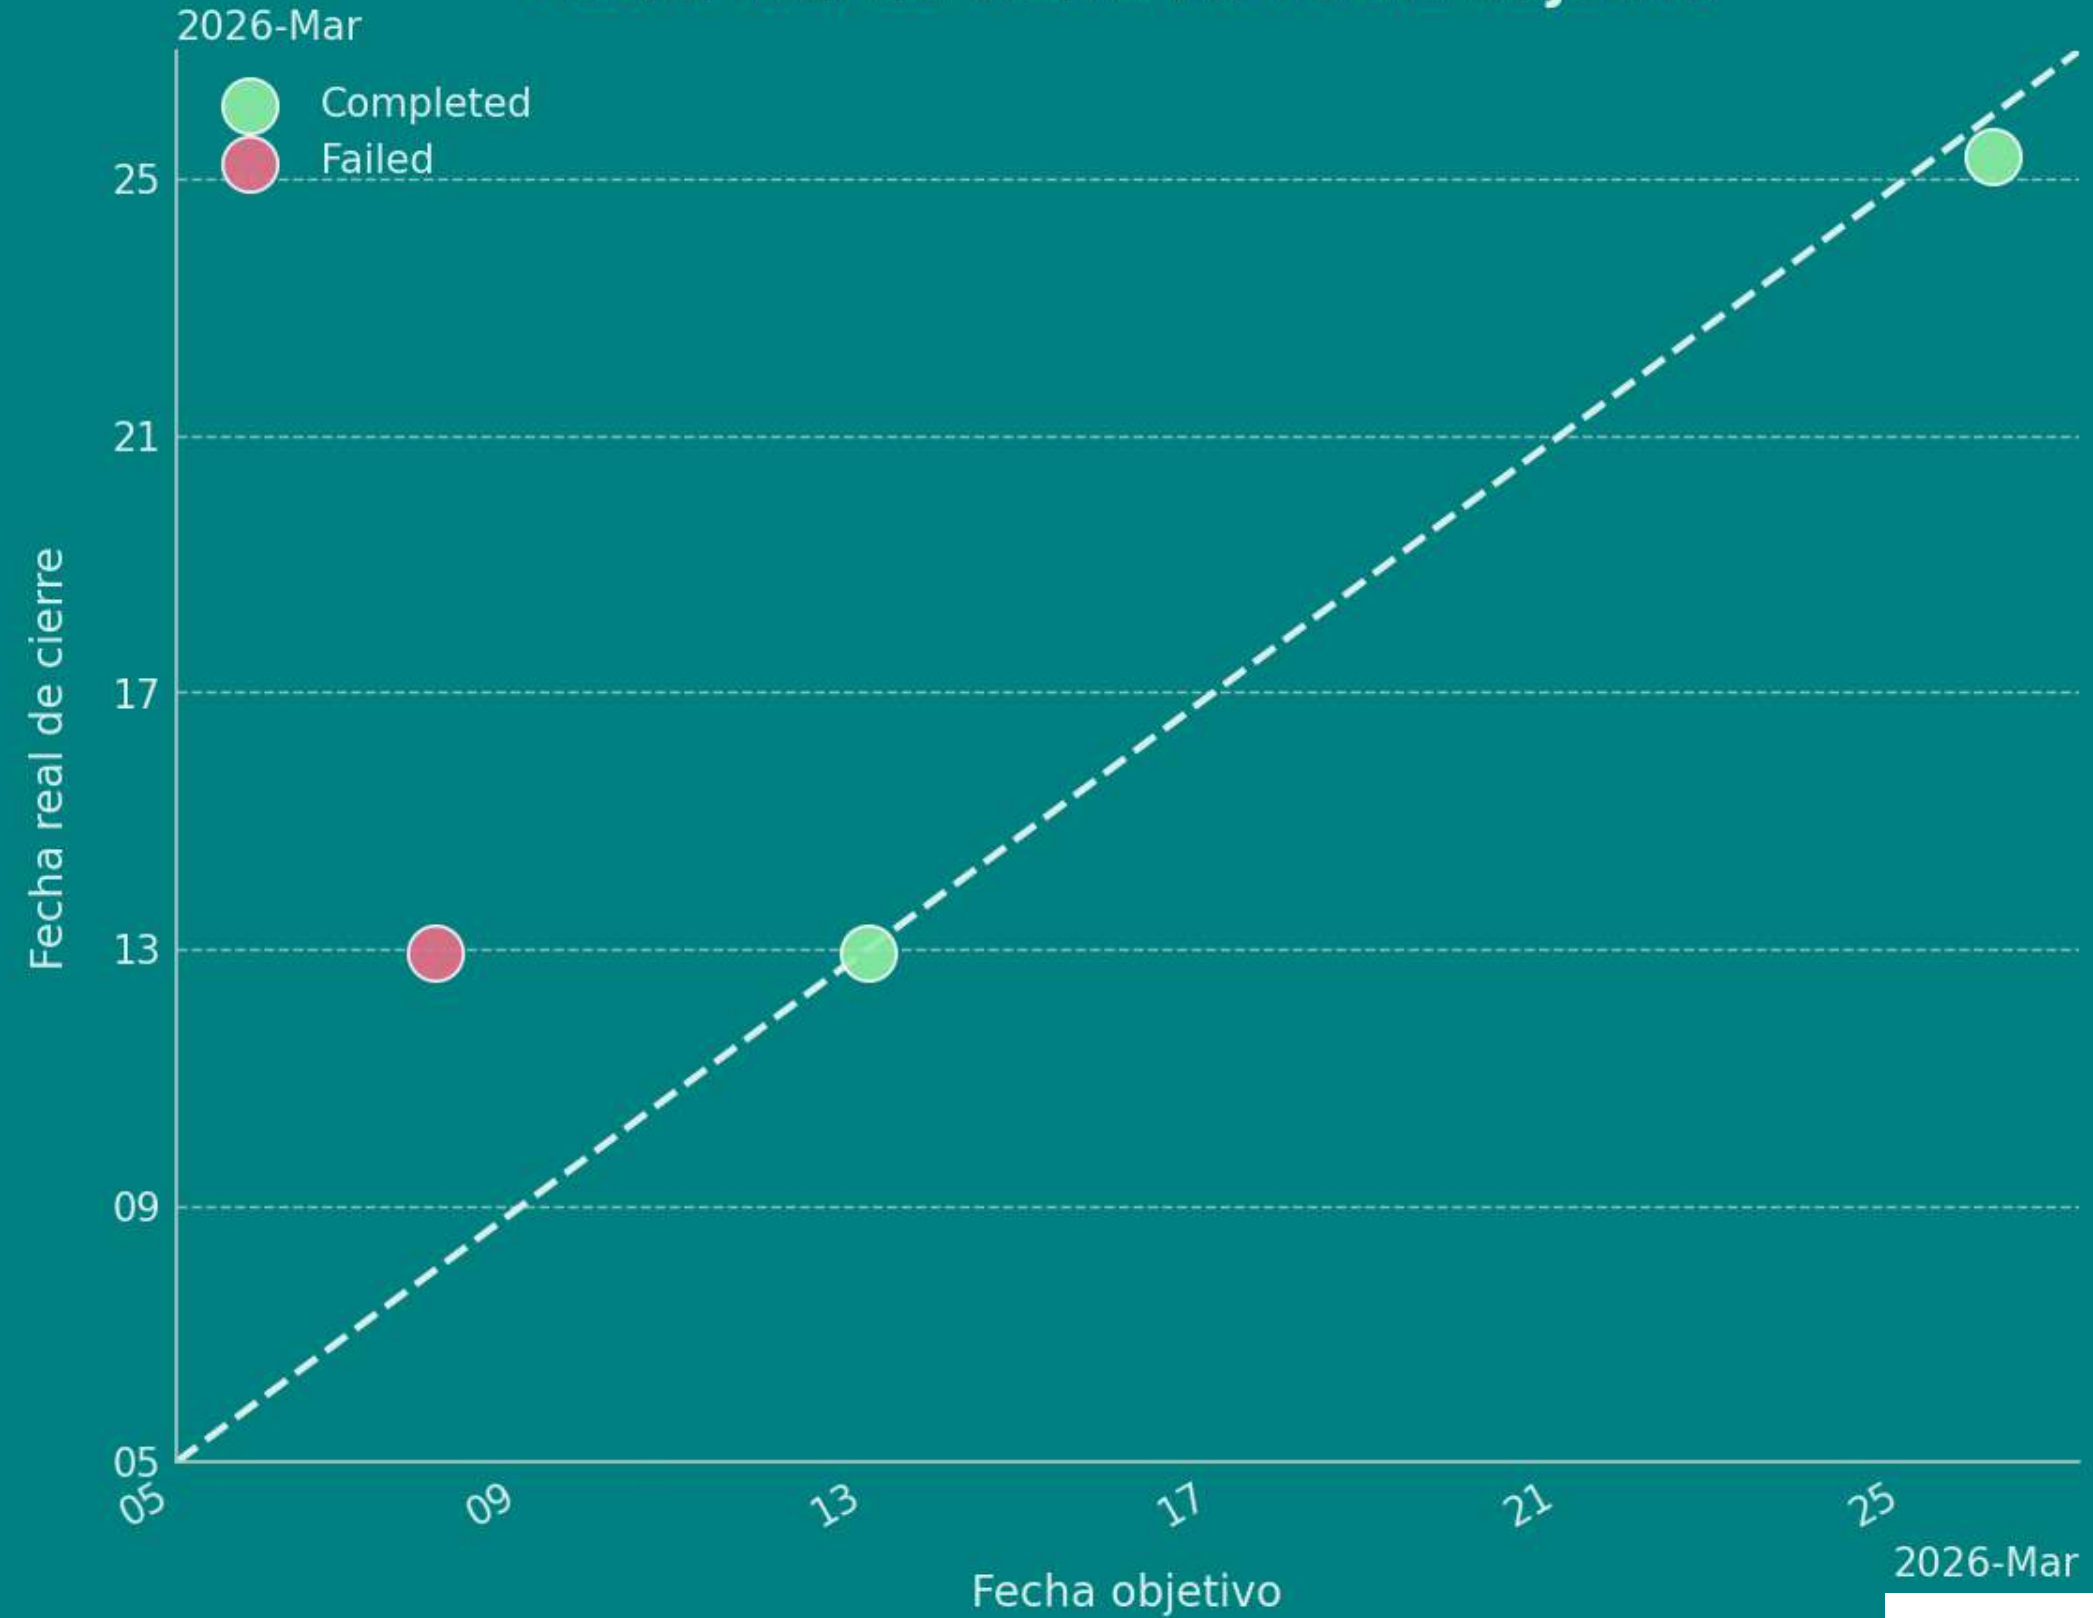

Usuarios Piloto



29 Inquilinos



8 Propietarios



3 Inmobiliarias

Usuarios Piloto

Captación



Grupos




Contacto directo
con caseros



Aumento del
alcance

Usuarios Piloto

Feedback recogido



Solicitar más feedback



Implementación



Usuarios Piloto

Problemas

UX/UI Inconsistente




Errores en publicación



Lógica de sesión



Flujos rígidos

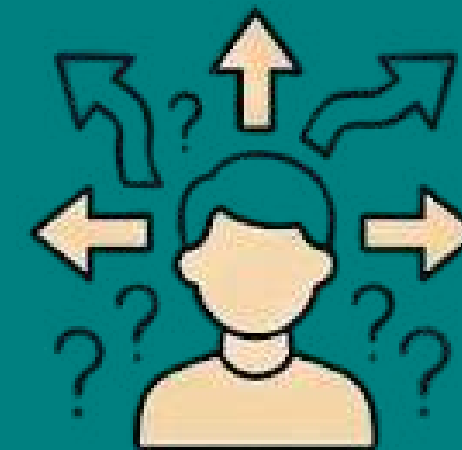


Usuarios Piloto

Notas



GESTIÓN DE CUENTAS
Y PERFIL
(Extensión)

4,7/5



EVALUACIÓN
Y MATCH


4,33/5



GESTIÓN
INMUEBLES

3,5/5

6. ¿Qué sigue?

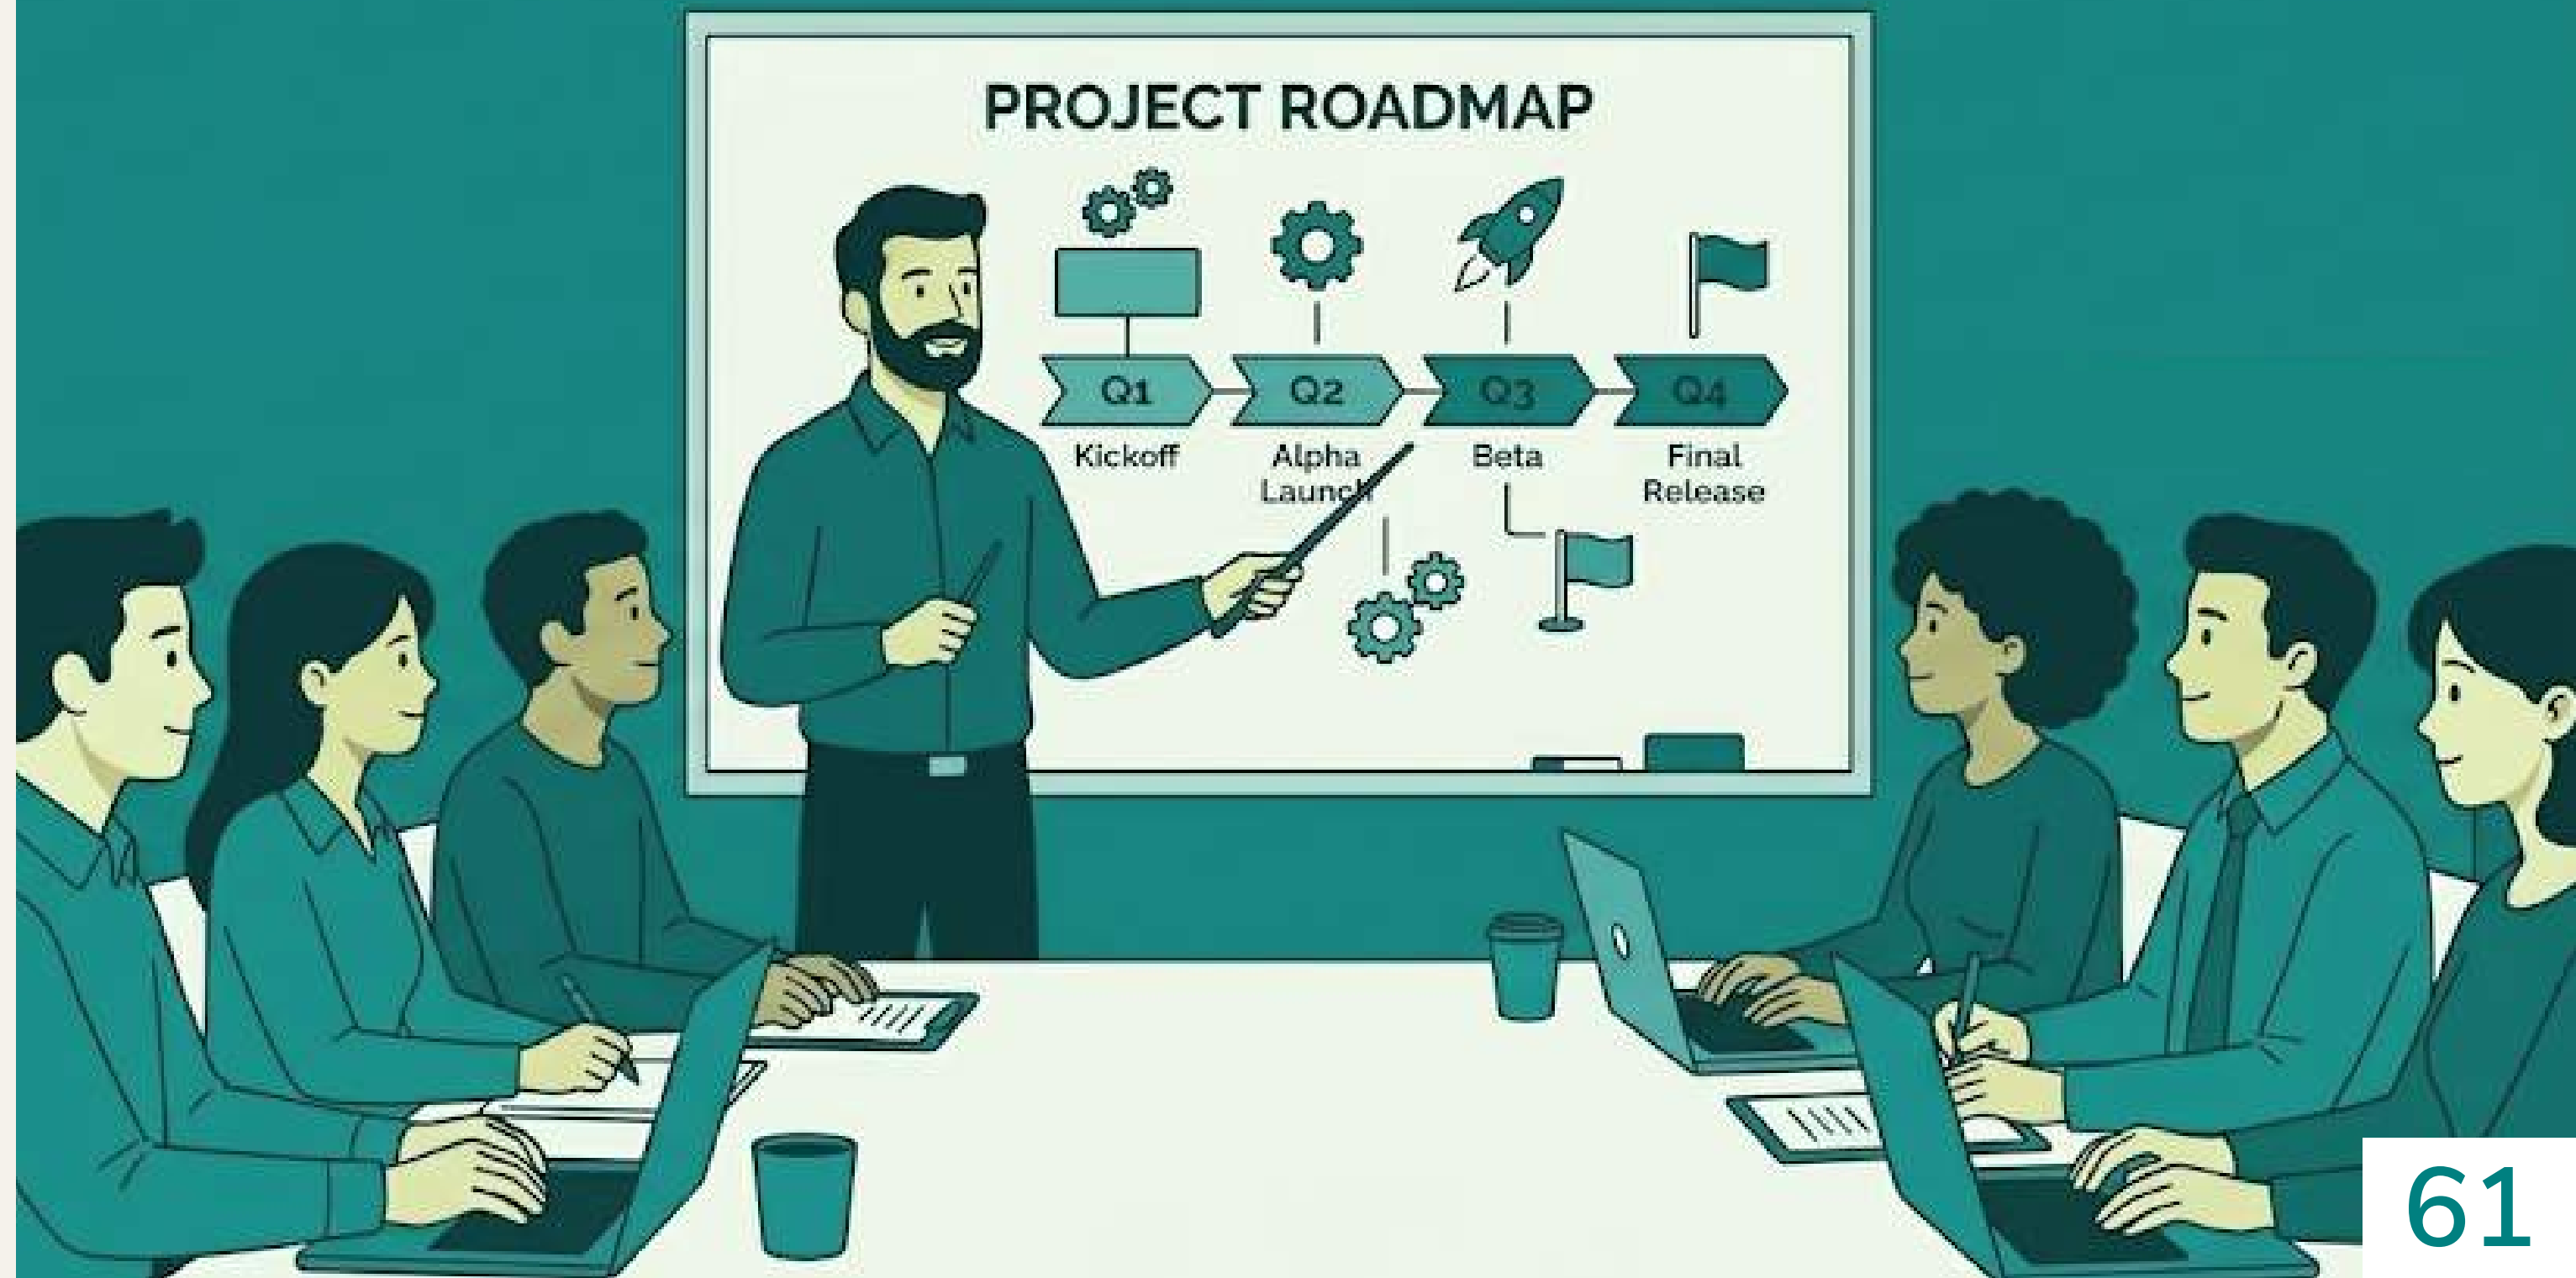

Plan Sprint 3

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3



DEADLINE
30/03



DEADLINE
02/03



Plan Sprint 3

Equipo 1



**GESTIÓN DE
NOTIFICACIONES**

Equipo 2



**IMPLEMENTACIÓN
DEL FEEDBACK**

Equipo 3




TESTING



DEADLINE
06/03



DEADLINE
09/03



**FILTROS AVANZADOS
PARA ARRENDADOR**



**IMPLEMENTACIÓN
DEL FEEDBACK**



TESTING

Plan Sprint 3

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3



DEADLINE
13/03



DEADLINE
16/03



Todos los pisos llevan a Rooma



@roomaapp
